Naručilac: Republika Srbija, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Investitor: Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom ''Infrastruktura železnice Srbije''
Pružalac usluge: Vodeći član grupe – Project Biro Utiber doo, Članovi konzorcijuma - Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional

Pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Novi Sad-Subotica-državna granica

IZVEŠTAJ BR. 100
08.04.2024. – 14.04.2024.

April 2024.

Kontrolni list

Naručilac:	Republika Srbija, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Investitor:	Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom ''Infrastruktura železnice Srbije''
Projekat:	Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Novi Sad-Subotica-državna granica
Ugovor:	Pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Novi Sad-Subotica-državna granica
Ugovor br:	404-02-133/4/2021-02 od 21.01.2022. 1/2022-1/103 od 21.01.2022. PBU-21/22 od 21.01.2022.
Naslov dokumenta:	Nedeljni Izveštaj br. 100 – 08.04.2024.-14.04.2024.
Broj dokumenta:	SEK3-N.IZV-100

	Pripremio	**Pregledao**	**Odobrio**
ORIGINAL	**IME I PREZIME**	**IME I PREZIME**	**IME I PREZIME**
	Dragan Gligorov	Dragan Gligorov	Dragan Gligorov
DATUM	**POTPIS**	**POTPIS**	**POTPIS**
April 2024.			

Ovaj izveštaj je pripremljen za Naručioca i Investitora, u skladu sa uslovima imenovanja Nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Novi Sad-Subotica-državna granica.

Sadržaj

1. RADOVI NA DEONICI NOVI SAD – SUBOTICA – DRŽAVNA GRANICA 4

1.1 RADOVI NA DEONICI NOVI SAD – VRBAS (ULAZ) 4
1.1.1 Radovi u infrastrukturnim objektima u službenim mestima 4
1.1.2 Radovi na donjem stroju 6
1.1.3 Radovi na gornjem stroju 9
1.1.4 Radovi na kontaktnoj mreži i elektro-energetskim postrojenjima 10
1.1.5 Radovi na SS i TK sistemima 12
1.1.6 Radovi na hidrotehničkim instalacijama 12
1.1.7 Geodetski radovi 13
1.1.8 Radovi na termotehničkim i mašinskim instalacijama 19
1.1.9 Mostovi i inženjerske konstrukcije 24
1.2 RADOVI NA DEONICI VRBAS (ULAZ) – NAUMOVIĆEVO (ULAZ) 28
1.2.1 Radovi u infrastrukturnim objektima u službenim mestima 28
1.2.2 Radovi na donjem stroju 33
1.2.3 Radovi na gornjem stroju 35
1.2.4 Radovi na kontaktnoj mreži i elektro-energetskim postrojenjima 38
1.2.5 Radovi na SS i TK sistemima 39
1.2.6 Radovi na hidrotehničkim instalacijama 40
1.2.7 Geodetski radovi 40
1.2.8 Radovi na termotehničkim i mašinskim instalacijama 42
1.2.9 Mostovi i inženjerske konstrukcije 43
1.3 RADOVI NA DEONICI NAUMOVIĆEVO (ULAZ) - SUBOTICA 47
1.3.1 Radovi u infrastrukturnim objektima u službenim mestima 47
1.3.2 Radovi na donjem stroju 49
1.3.3 Radovi na gornjem stroju 51
1.3.4 Radovi na kontaktnoj mreži i elektro-energetskim postrojenjima 53
1.3.5 Radovi na SS i TK sistemima 53
1.3.6 Radovi na hidrotehničkim instalacijama 54
1.3.7 Geodetski radovi 55
1.3.8 Radovi na termotehničkim i mašinskim instalacijama 58
1.3.9 Mostovi i inženjerske konstrukcije 59

2. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU 62

3. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 69

4. FINANSIJSKI IZVEŠTAJ 70

5. STATUS PREGLEDA PZI PROJEKTA 82

6. SASTANCI 91

7. ZAHTEVI ZA SAGLASNOST SA MATERIJALIMA 92

8. STATUS RADOVA 93

1. RADOVI NA DEONICI NOVI SAD – SUBOTICA – DRŽAVNA GRANICA

1.1 Radovi na deonici Novi Sad – Vrbas (ulaz)

1.1.1 Radovi u infrastrukturnim objektima u službenim mestima

NOVI SAD

Putnički i teretni pothodnik u stanici Novi Sad, peronski zidovi, peronske nadstrešnice, stanična zgrada

ETP zgrada u Stanici Novi Sad

KISAČ

Putnički pothodnik u stanici Kisač, peronski zidovi, peronske nadstrešnice, stanična zgrada

Projekat zgrade PS u stanici Kisač

Projekat zgrade SS i TK u Kisaču

STEPANOVIĆEVO

Putnički pothodnik u stanici Stepanovićevo, peronski zidovi, peronske nadstrešnice

Projekat zgrade SS i TK u Stepanovićevo

ZMAJEVO

Putnički pothodnik u stanici Zmajevo

Projekat zgrade SS i TK u stanici Zmajevo

Projekat zgrade PSN u stanici Zmajevo

Arhitektonski radovi

<u>Radovi na staničnoj zgradi Novi Sad FAZA 2</u>

- Oblaganje elemenata vestibila i nadstrešnice vestibila, mozaik keramikom u svemu prema dogovoru sa predstavnikom zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada. Akcenat na preciznom radu i poštovanju detalja i sugestija.
- Izvođenje radova na popločavanju ispred krila B I krila C. Nasipanje slojeva, betoniranje ploče, postavljanje kamena, semerlocka I behatona
- Postavljanje aluminijumske konstrukcije kioska ispod novoprojektovane galerije u vestibilu krila B, zastakljivanje i završetak radova na mašinskim instalacijama i elektro a po novom tehničkom rešenju.
- Izrada hidroizolacije na nadstrešnici iznad ulaza u vestibil.

- Priprema fasade krila C za završnu obradu, termika, mrežica i lepak

<u>Radovi na staničnoj zgradi Zmajevo</u>

- Izvodi se sokla na fasadi objekta
- Još uvek se radi na betoniranju ispred objekta. Potraživanje saglasnosti od projektanta za neusaglačenost terena u projektu i na licu mesta.

- Nasipanje zemlje u velikim betonskim žardinjerama
- Potraživanje od nadzora VIK za projektom odvodnjavanja na behatonu

Radovi na staničnoj zgradi i SS/TK Zmajevo

- Nisu završeni detalji na fasadi
- Unutrašnjost je grubo obrađena, radi se gletovanje i molerajpostavljena keramika
- Već se vrši unošenje opreme
- Ispod okapnice potrebna detaljna obrada
- Izrada detalja oluka na nadstrečnicama iznad ulaza u objekat
- U OBILASKU PRIMEĆENO DA NIJE URAĐENA HIDROIZOLACIJA UNUTAR OBJEKTA „KADA“ KAO ŠTO JE NAVEDENO U PROJEKTU. HITNO IZVESTI I VERTIKALNI PREMAZ ILI SL, DATI PRETHODNO TEHNOLOGIJU, HITNO !!!

Radovi na staničnoj zgradi i SS/TK Kisač

- Sokla nije izvedena, pozicija otvorena za izvođenje.
- Očekuje se poćetak ispravke fasade, po dogovoru, neoverena fasada u građeinskim knigama. Čeka se završetak pejzašnog uređenja da bi otpočeli radovi ispravke.
- U toku su pripreme za radove na uređenju oko objekta. Raščišćavanje šuta i uređenje terena. Sinhronizovati radove kako ne bi došlo do oštećenja istih. Potrebno uraditi stepeništa.
- Na zgradi SSiTK postoje elementi na fasadi koje treba popraviti. Takođe je otvorena pozicija za parterno uređenje.
- Pothodnici i nadstrešnice u fazi ispravke, raščišćavanja i dorade

Radovi na PS Kisač

- Prekinuti radovi na pokrivanju limom zbog vune koja je pod vodom ispod lima.
- Evidentna procurivanja unutar objekta.
- Urašena je gruba unutrašnja obrada zidova iako nije završeno pokrivanje krova.
- Nadzor poslao pismo da se promeni vuna i osb, da se osuši ploča pa tek nastavi sa pokrivanjem.

1.1.2 Radovi na donjem stroju

Otvorena pruga Novi Sad - Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60)

- Uređenje okolnog terena.

Stanica Rumenka (km 83+278.60 - km 84+645.56)

- Uređenje okolnog terena.

Otvorena pruga Rumenka - Kisač (km 84+645.56 - km 89+881.88)

- Uređenje okolnog terena.

Stanica Kisač (km 89+881.88 - km 91+174.14)

- Uređenje okolnog terena.

Otvorena pruga Kisač – Stepanovićevo (km 91+174.14 - km 96+904.10)

- Uređenje okolnog terena.

Stanica Stepanovićevo (km 96+904.10 - km 97+769.04)
- Uređenje okolnog terena.

Otvorena pruga Stepanovićevo – Zmajevo (km 97+769.04 - km 102+189.67)
- Uređenje okolnog terena.

Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 84+809.19 pruge, Pristupni put službenom mestu Rumenka na km 84+043.75 pruge

Denivelacija atarskog puta
- Izrada nosećeg sloja od DKA 0/31mm.

Pristupni put službenom mestu
- Izrada nosećeg sloja od DKA 0/31mm.

Denivelacija lokalnog puta – nadvožnjak na km 89+315.15 pruge

Denivelacija atarskog puta
- Izrada nasipa.
- Uređenje posteljice.
- Izrada nosećeg sloja od DKA 0/63mm.
- Izrada nosećeg sloja od DKA 0/31mm.
- Izrada sloja BNS 22 A
- Izrada sloja AB 11

Servisni putevi broj 1 i 5
- Širok iskop.
- Uređenje podtla.

Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 92+768.08 pruge

Saobraćajnica S1
- Izrada nosećeg sloja od DKA 0/63mm.
- Humuziranje kosina.

Denivelacija lokalnog puta – podvožnjak na km 97+027.31 pruge, Pristušni put objektu SS i TK na km 97+058.16 pruge
- Rušenje postojećeg kolovoza.

Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 101+132.33 pruge
- Izrada nosećeg sloja od DKA 0/63mm
- Humuziranje kosina.

Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 105+797.12 pruge
- Izrada nasipa.
- Uređenje posteljice.
- Izrada nosećeg sloja od DKA 0/63mm.

Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 108+115.69 pruge

Denivelacija atarskog puta
- Izrada nosećeg sloja od DKA 0/63mm.
- Humuziranje kosina.

Pristupni put TK objektu
- Širok iskop.
- Uređenje podtla.

- Postavljanje geotekstila.
- Izrada nasipa.
- Uređenje posteljice.

Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 84+809.19 pruge, Pristupni put službenom mestu Rumenka na km 84+043.75 pruge

Denivelacija lokalnog puta – nadvožnjak na km 89+315.15 pruge

Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 101+132.33 pruge

Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 105+797.12 pruge

<u>Izvršena su geomehanička ispitivanja i u skladu sa rezultatima merenja izvršen je prijem izvedenih slojeva na sledećim deonicama:</u>

- Završni sloj nasipa (posteljica) od km 0+050 do km 0+193.90, Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 105+797.12 pruge.
- Završni sloj nasipa (posteljica) od km 0+075 do km 0+125, Denivelacija lokalnog puta – nadvožnjak na km 89+315.15 pruge.
- Donji noseći sloj od dka 0/63mm od km 0+075 do km 0+125, Denivelacija lokalnog puta – nadvožnjak na km 89+315.15 pruge.
- Noseći sloj od dka 0/31mm od km 0+000 do km 0+125, Denivelacija lokalnog puta – nadvožnjak na km 89+315.15 pruge.
- Završni sloj nasipa (posteljica) od km 0+306.20 do km 0+400, Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 105+797.12 pruge.
- Donji noseći sloj od dka 0/63mm od km 0+050 do km 0+193.90, Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 105+797.12 pruge.
- Noseći sloj od dka 0/31mm od km 0+000 do km 0+168.95 i od km 0+281.25 do km 0+495, Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 84+809.19 pruge, Pristupni put službenom mestu Rumenka na km 84+043.75 pruge.
- Asfaltiranje, izrada sloja BNS 22 A od km 0+483.62 do km 1+500, Denivelacija lokalnog puta – nadvožnjak na km 89+315.15 pruge.

- Donji noseći sloj od dka 0/63mm od km 0+000 do km 0+218.04, Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 101+132.33 pruge.
- Donji noseći sloj od dka 0/63mm od km 0+306.20 do km 0+499, Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 105+797.12 pruge.
- Noseći sloj od dka 0/31mm prisutpnog puta službenom mestu Rumenka od 0+000 do km 0+834.74, Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 84+809.19 pruge, Pristupni put službenom mestu Rumenka na km 84+043.75 pruge.
- Asfaltiranje, izrada sloja AB 11 od km 0+371.59 do km 0+483.62, Denivelacija lokalnog puta – nadvožnjak na km 89+315.15 pruge.
- Podtlo pristupnog puta TK objektu od 0+020 do km 0+194.69, Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 108+115.69 pruge.
- Podtlo servisnog puta br. 1 od 0+000 do km 0+381.09, Denivelacija lokalnog puta – nadvožnjak na km 89+315.15 pruge.
- Podtlo servisnog puta br. 5 od 0+000 do km 0+250, Denivelacija lokalnog puta – nadvožnjak na km 89+315.15 pruge.
- Završni sloj nasipa (posteljica) pristupnog puta TK objektu od 0+020 do km 0+194.69, Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 108+115.69 pruge.

1.1.3 Radovi na gornjem stroju

U izveštajnom periodu na prvoj deonici izvođeni su sledeći radovi:

1. Prijem materijala:

- Betonski pragovi:
  - Sajlovo: 1305 komada betonskih pragova dužine 2,60m.
    90 komada betonskih pragova dužine 2,40m.
    925 komada betonskih pragova dužine 2,60m.
    630 komada betonskih pragova dužine 2,40m.
    120 komada betonskih pragova dužine 2,60m za mostove.
    60 komada betonskih pragova dužine 2,60m za mostove.
    90 komada betonskih pragova dužine 2,40m.
    120 komada betonskih pragova dužine 2,60m za mostove.

2. Radovi na trasi

Novi Sad-Rumenka

- Ugradnja 23 pružne oznake.
- Završno mašinsko regulisanje desnog koloseka km81+900-km82+000 i levog koloseka (km82+800+km83+200).
- Polaganje veznog koloseka 2 (km2+203.767-km3+121.8).

Stanica Rumenka

- Završno mašinsko regulisanje desnog koloseka (km83+600-km84+200).
- Završno mašinsko regulisanje skretnica 2 i 3.
- Završno mašinsko regulisanje skretnica broj 11 i broj 4.

Kisač-Stepanovićevo

- Završno mašinsko regulisanje desnog koloseka (km96+500+km96+800) i levog koloseka (km96+400-km96+900).

Stepanovićevo-Zmajevo

- Završno mašinsko regulisanje desnog koloseka (km101+200-km101+700) i levog koloseka km101+100-km101+800).

Stanica Stepanovićevo
- Ugradnja 22 pružne oznake.
- Završno mašinsko regulisanje skretnica 2,3,4,8.
- Završno mašinsko regulisanje skretnice 10.

Stanica Zmajevo
- Završno mašinsko regulisanje skretnice broj 2.
- Završno mašinsko regulisanje skretnica broj 1 i broj 4.

Stanica Kisač
- Završno mašinsko regulisanje skretnice 10.

1.1.4 Radovi na kontaktnoj mreži i elektro-energetskim postrojenjima

Stanica Novi Sad:
- Montaža ormana GRO-DA, ispitivanje kablova.
- Iskop rova za polaganje kablova za rastavljače KM.

RTU Rumenka:
- Polaganje kablova za rastavljače KM.

SS i TK Rumenka:
- Montaža dizel agregata.

PS Kisač:
- Montaža i pozicioniranje visokonaponske opreme.



Radovi na kontaktnoj mreži

1. **Stanica Novi Sad:**
   - **km 77+200 – km 78+800:**
     - montaža vođica tegova; regulacija prema vrednosti AB (148, 236, 244);
     - fina regulacija na zateznom polju 4-2 (148-230) i zateznom polju 4-3;
     - montaža strujnih veza, krutih potpora konzola i žica protiv vetra (184-200);
     - montaža 2 skretnice i 1 ukrsnice u preklopu;
   - **km 81+700 – km 83+200:**
     - regulacija KM na zateznom polju 1-3 (198-242).
2. **OP Novi Sad – Rumenka:**
   - **km 81+700 – km 83+200:**
     - povezivanje povratnih provodnika sa šinama (61, 62, 351, 352);
     - fina regulacija KM na zateznom polju 1-5;
     - regulacija KM na zateznim poljima 1-5, 1-4, 2-4, 1-3 (242-297), 2-3 (243-298);

- montaža strujnih veza u preklopu (280, 281, 293, 294, 328, 329, 338, 339);

- **km 78+300 – km 91+600:**
  - fina regulacija KM na zateznim poljima 4-3 (235-241), 1-1 (38-77), 1-2 (65-81), 2-1 (236-244 i 70-78), 2-2 (66-94);
  - regulacija izolovanog preklopa na zateznim poljima 2-2, FX2, 2-3 (173-199) i 1-2, FX1, 1-3 (172-182);
  - regulacija strujnih veza (72, 77);
  - zamena nosača poligonatora (89);
  - montaža 4 vešaljke (198-202);
  - montaža 8 strujnih veza (179, 178, 198, 197, 188, 190, 187, 199);
  - regulacija neutralne sekcije 178-202 i neutralne sekcije 177-201;
  - regulacija KM na zateznim poljima 2-3 (203-243), 1-3 (204-244), 1-2 (81-172), 2-2 (98-146);
  - regulacija 10 konzola (89, 93, 97, 101, 105, 118, 122, 126, 130, 133);
  - regulacija "Y" užadi (105-118);
  - montaža pričvrsnika konzola (131, 134, 137, 143, 143-1, 146, 148).

3. **Stanica Rumenka:**
   - **km 83+000 – km 85+000:**
     - regulacija prema vrednosti AB (86, 87);
     - fina regulacija na zateznim poljima 3-1 (6-61) i 2-1;
     - regulacija prema vrednosti AB (112, 113);
     - montaža strujnih veza u preklopu (5, 6, 13, 14, 80, 81, 84, 85);
     - razvlačenje NU na zatezom polju 1 (1288.3), D2 (289.1 m), D4 (174.3 m);
     - montaža stezaljki NU na koloseku 1 i zateznim poljima D2 i D4;
     - montaža 2 kom. UAZ za NU (33, 106);
     - montaža sidara (106, 97, 60, 33);
     - montaža 40 tegova (106, 33).
4. **OP Rumenka – Kisač:**
   - **km 84+800 – km 89+900:**
     - povezivanje povratnog provodnika sa šinama (19, 20, 141, 142);
     - montaža tablica sa brojevima stubova (1-162);
     - regulacija KM (poligonacija, sistemska visina);
     - montaža osigurača (ploče) na zateznim poljima 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
5. **Stanica Kisač:**
   - **km 89+517 – km 91+550:**
     - montaža tablica sa brojevima stubova (1-84);
     - regulacija KM (poligonacija, sistemska visina) (75-83).
6. **OP Kisač – Stepanovićevo:**
   - **km 91+375 – km 96+706:**
     - montaža tablica sa brojevima stubova (1-174);
     - regulacija KM (poligonacija, sistemska visina) na zateznim poljima 1 (1-23), 2, 4, 6, 7, 9 (60-80).
7. **Stanica Stepanovićevo:**
   - **km 96+550 – km 98+125:**
     - montaža tablica sa brojevima stubova (1-68);
     - regulacija KM (poligonacija, sistemska visina) na zateznim poljima 3 i 4.
8. **OP Stepanovićevo – Zmajevo:**
   - **km 97+825 – km 102+125:**
     - montaža tablica sa brojevima stubova (1-130).
9. **Stanica Zmajevo:**

- **km 101+738 – km 103+800:**
  - montaža tablica sa brojevima stubova (1-80).

1.1.5 Radovi na SS i TK sistemima

U izveštajnom periodu izvođeni su sledeći radovi:
- Novi Sad - Vrbas - mortiranje i uzemljivanje granično-kolosečnih signala
- Rumenka, Zmajevo - montiranje grejača skretnica
- Testiranje signalne opreme u stanici Zmajevo.

Nastavljeni su radovi na izvođenju SS/TK prodora.

Sledeća tabela pokazuje procenat izvršenja prodora:

Section 1 : Novi Sad-VRBAS NOVA	
Quantity	323
Quantity completed	295
Percent completed	**91%**

1.1.6 Radovi na hidrotehničkim instalacijama

Mašinski iskop zemlje i betoniranje ploče protiv uzgona za crpnu stanicu u zoni podvožnjaka u Stepanovićevu na km 97+027

Priključenje crpne stanice u zoni pešačko biciklističkog pothodnika na elektro mrežu u Kisaču,na km 89+984

Ugradnja završnih betonskih ploča za rezervoar tehničke vode i vodonepropusnu septičku jamu za objekat EVP Novi Sad

Ugradnja linijskog montažnog kanala za odvodnjavanje atmosferske vode u pešačko biciklističkom pothodniku u Kisaču,na km 89+984

1.1.7 Geodetski radovi

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		Otvorena pruga Novi Sad - Rumenka. Geodetska kontrola oplate (remenata) obloženog betonskog kanala od PR 1 (km 2+450,00) do PR 15 (km 2+800,00) - kolosek Ranžirna leva profilna strana, broj najave NSSU-S1.2-D1-SUB-RIA-gk036.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
2		Otvorena pruga Stepanovićevo - Zmajevo. Geodetska kontrola temeljne jame pre betoniranja temelja stuba žičane ograde od PR 967 km 100+400 do PR 995 km 101+100 - desna strana, broj najave NSSU-S1.8-D1-SUB-FNC-RIA-g006.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
3		Deonica Zmajevo Vrbas - Saobraćajnica na km 105+797,12. Geodetska kontrola završnog sloja nasipa - postelja saobraćajnice PR 3 km 0+050,00 do PR 9 km 0+193,90, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-OP8-RIA-g043.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
4		EVP u železničkoj stanici Novi Sad km 79+985. Geodetska kontrola vertikalnosti montirane čelične konstrukcije(nosača) temelja opreme spoljnog postrojenja, broj najave NSSU-S1-D1-STR-OCS-ST1EVP-RIA-g074.	Pozicija nije u granicama dozvoljenih odstupanja.
5		Otvorena pruga Novi Sad - Rumenka. Geodetska kontrola GIŠ-a Levi kolosek od km 77+448.48 do km 83+247.18, Desni kolosek od km 77+460.45 do km 83+252.74, broj najave NSSU-S1-D1-SST-RIA-g095.	Na levom koloseku u zoni privremene skretnice od stacionaže 79+333,87 do 80+087,22 pozicija nije u granicama dozvoljenih odstupanja. Ostatak pozicije je u granicama dozvoljenih odstupanja.
6		Stanica Rumenka. Geodetska kontrola GIŠ-a Levi kolosek (kolosek broj 2) od km 83+278.66 do km 84+645.56, Desni kolosek (kolosek broj 3) od km 83+337.97 do km 84+640.70, broj najave NSSU-S1-D1-SST-RIA-g096.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
7		Otvorena pruga Rumenka - Kisač. Geodetska kontrola GIŠ-a Levi kolosek od km 84+682.56 do km 89+846.20, Desni kolosek od km 84+682.48 do km 89+845.38, broj najave NSSU-S1-D1-SST-RIA-g097.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.

8		Deonica Rumenka Kisač - Nadvožnjak na km 89+315.15. Geodetska kontrola pozicije i visine ivičnjaka na nadvožnjaku, broj najave NSSU-S1-D1-STR-OP2-RIA-g216-R1.	Pozicija nije u granicama dozvoljenih odstupanja.
9		Deonica Rumenka Kisač - Saobraćajnica na km 89+315.15. Geodetska kontrola završnog sloja nasipa od PR 04 km 0+075.00 do PR 06 km 0+125.00, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-OP2-RIA-g078.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
10		Deonica Rumenka Kisač - Saobraćajnica na km 89+315.15. Geodetska kontrola drobljenog kamenog agregata 00-63 od PR 04 km 0+075.00 do PR 06 km 0+125.00, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-OP2-RIA-g079.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
11		Deonica Rumenka Kisač - Saobraćajnica na km 89+315.15. Geodetska kontrola drobljenog kamenog agregata 00-31 od PR 01 km 0+000.00 do PR 06 km 0+125.00, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-OP2-RIA-g080.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
12		Stanica Kisač. Geodetska kontrola GIŠ-a Levi kolosek (kolosek broj 2) od km 89+892.47 do km 91+159.05, Desni kolosek (kolosek broj 3) od km 89+881.88 do km 91+174.14, broj najave NSSU-S1-D1-SST-RIA-g098.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
13		Otvorena pruga Kisač - Stepanovićevo. Geodetska kontrola GIŠ-a Levi kolosek od km 91+205.58 do km 96+872.61*, Desni kolosek od km 91+205.68 do km 96+872.65*, broj najave NSSU-S1-D1-SST-RIA-g099.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
14		Stajalište Stepanovićevo. Geodetska kontrola GIŠ-a Levi kolosek (kolosek broj 2) od km 96+904.06 do km 97+769.02, Desni kolosek (kolosek broj 3) od km 96+919.10 do km 97+753.93, broj najave NSSU-S1-D1-SST-RIA-g100.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
15		Stanica Stepanovićevo. Geodetska kontrola kanalizacione mreže, broj najave NSSU-S1-D1-HYD-RIA-NI-g032.	Pozicija nije u granicama dozvoljenih odstupanja.
16		Otvorena pruga Stepanovićevo - Zmajevo. Geodetska kontrola GIŠ-a Levi kolosek od km 97+800.49 do km 102+108.60, Desni kolosek od km 97+800.45 do km 102+108.18, broj najave NSSU-S1-D1-SST-RIA-g101.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
17		Otvorena pruga Stepanovićevo - Zmajevo. Geodetska kontrola temeljne jame pre betoniranja temelja stuba žičane ograde od PR 1000 km 101+200 do PR 1020 km	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.

		101+700 - desna strana, broj najave NSSU-S1.8-D1-SUB-FNC-RIA-g008.	
18		Stanica Zmajevo. Geodetska kontrola GIŠ-a Levi kolosek (kolosek broj 2) od km 102+189.68 do km 103+382.06, Desni kolosek (kolosek broj 3) od km 102+204.77 do km 103+366.71, broj najave NSSU-S1-D1-SST-RIA-g0102.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
19		Otvorena pruga Zmajevo - Vrbas Nova. Geodetska kontrola GIŠ-a Levi kolosek od km 103+413.44 do km 112+951.14, Desni kolosek od km 103+413.62 do km 112+951.44, broj najave NSSU-S1-D1-SST-RIA-g0103.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
20		Deonica Zmajevo Vrbas - Saobraćajnica na km 105+797,12. Geodetska kontrola završnog sloja nasipa - posteljica saobraćajnice od PR 15 km 0+306,20 do PR 19 km 0+400,00, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-OP8-RIA-g044.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
21		Deonica Zmajevo Vrbas - Saobraćajnica na km 105+797,12. Geodetska kontrola DKA 0-63 saobraćajnice PR 1 km 0+050,00 do PR 9 km 0+193,90, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-OP8-RIA-g045.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
22		EVP u železničkoj stanici Novi Sad km 79+985. Geodetska kontrola vertikalnosti montirane čelične konstrukcije (nosača) temelja opreme spoljnog postrojenja, broj najave NSSU-S1-D1-STR-OCS-ST1EVP-RIA-g074-R1.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
23		Deonica Rumenka Kisač - Pristupni put na km 84+043.75. Geodetska kontrola drobljenog kamenog agregata 00/31 od PR 1 km 0+000.00 do PR 8 km 0+168.95 i od PR 14 km 281.25 do PR 24 km 0+495.00, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-OP1-RIA-g050.	Pozicija nije u granicama dozvoljenih odstupanja.
24		Deonica Stepanovićevo Zmajevo - Saobraćajnica na km 101+132,33. Geodetska kontrola DKA 0-63 saobraćajnice od PR 1 km 0+000,00 do PR 10 km 0+218,04, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-OP6-RIA-g044.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
25		Deonica Zmajevo Vrbas - Saobraćajnica na km 105+797,12. Geodetska kontrola DKA 0-63mm saobraćajnice od PR 15 km 0+306,20 do PR 23 km 0+499,00, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-OP8-RIA-g046.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
26		ETP stanica. Geodetska kontrola oplate zidova kanala i stubova, broj najave NSSU-S1-D1-STR-ETP-RIA-g029.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.

27		Stanica Kisač. Geodetska kontrola kanalizacione mreže, broj najave NSSU-S1-D1-HYD-RIA-NI-g033.	Pozicija je geodetski snimljena.
28		Otvorena pruga Stepanovićevo-Zmajevo. Geodetska kontrola temeljne jame pre betoniranja temelja stuba žičane ograde od PR 1020 km 101+700 do PR 1030 km 101+950-desna, broj najave NSSU-S1.8-D1-SUB-FNC-RIA-g011.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
29		Otvorena pruga Stepanovićevo-Zmajevo. Geodetska kontrola temeljne jame pre betoniranja temelja stuba žičane ograde od PR 881 km 98+275 do PR 902 km 98+800 - desna, broj najave NSSU-S1.8-D1-SUB-FNC-RIA-g012.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
30		Deonica Rumenka Kisač - Pristupni put na km 84+043.75. Geodetska kontrola drobljenog kamenog agregata 00/31 od PR 1 km 0+000.00 do PR 35 km 0+834.74, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-OP1-RIA-g051.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
31		Otvorena pruga Rumenka - Kisač. Geodetska kontrola ugrađenih temelja stubova žičane ograde od PR 336 km 84+875 do PR 385 km 86+100 - leva i desna strana, broj najave NSSU-S1.4-D1-SUB-FNC-RIA-g007.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
32		Otvorena pruga Stepanovićevo - Zmajevo. Geodetska kontrola temeljne jame pre betoniranja temelja stuba žičane ograde od PR 902 km 98+800 do PR 922 km 99+300 - desna strana, broj najave NSSU-S1.8-D1-SUB-FNC-RIA-g015.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
33		Deonica Zmajevo Vrbas - Saobraćajnica na km 108+115,69, pristupni put objektu SS I TK. Geodetska kontrola podtla pristupnog puta za SS I TK od km 0+020,00 do km 0+194,69, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-OP9-RIA-g052.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
34		Otvorena pruga Rumenka - Kisač. Geodetska kontrola ugrađenih temelja stubova žičane ograde od PR 385 km 86+100 do PR 513 km 89+300 - leva i desna strana, broj najave NSSU-S1.4-D1-SUB-FNC-RIA-g008.	Pozicija nije u granicama dozvoljenih odstupanja.
35		Otvorena pruga Kisač -Stepanovićevo. Geodetska kontrola ugrađenih temelja stubova žičane ograde od PR 682 km 93+400 do PR 760 km 95+350 - leva i desna strana, broj najave NSSU-S1.6-D1-SUB-FNC-RIA-g007.	Pozicija nije u granicama dozvoljenih odstupanja.

36		Stanica Stepanovićevo. Geodetska kontrola temeljne jame pre betoniranja temelja stuba žičane ograde od PR 847 km 97+475 do PR 859 km 97+769,04 - leva i desna strana, broj najave NSSU-S1.7-D1-SUB-FNC-RIA-g003.	Pozicija je geodetski snimljena.
37		Otvorena pruga Stepanovićevo - Zmajevo. Geodetska kontrola temeljne jame pre betoniranja temelja stuba žičane ograde od PR 859 km 97+769.04 do PR 865 km 97+925 - leva i desna strana, broj najave NSSU-S1.8-D1-SUB-FNC-RIA-g018.	Pozicija je geodetski snimljena.
38		Otvorena pruga Stepanovićevo - Zmajevo. Geodetska kontrola temeljne jame pre betoniranja temelja stuba žičane ograde od PR 922 km 99+300 do PR 941 km 99+750 - desna strana, broj najave NSSU-S1.8-D1-SUB-FNC-RIA-g019.	Pozicija je geodetski snimljena.
39		Otvorena pruga Zmajevo - Vrbas. Geodetska kontrola ugrađenih temelja stubova žičane ograde od PR 1098 km 103+450 do PR 1160 km 105+000 - leva i desna strana, broj najave NSSU-S1.10-D1-SUB-FNC-RIA-g008.	Pozicija je geodetski snimljena.
40		Otvorena pruga Novi Sad-Rumenka. Geodetska kontrola ugrađenih temelja stubova žičane ograde od PR 179 km 80+950 do PR 246+9m km 82+634 - leva i desna strana, broj najave NSSU-S1.2-D1-SUB-FNC-RIA-g014.	Pozicija je geodetski snimljena.
41		Otvorena pruga Novi Sad-Rumenka. Geodetska kontrola ugrađenih temelja stubova žičane ograde od PR 246+9m km 82+634 do PR 271 km 83+250 - leva i desna strana, broj najave NSSU-S1.2-D1-SUB-FNC-RIA-g015.	Pozicija je geodetski snimljena.
42		Stanica Rumenka. Geodetska kontrola ugrađenih temelja stubova žičane ograde od PR 271 km 83+250 do PR 279 km 83+450 - leva i desna strana, broj najave NSSU-S1.3-D1-SUB-FNC-RIA-g005.	Pozicija je geodetski snimljena.
43		Deonica Rumenka Kisač - Saobraćajnica na km 84+043.75. Geodetska kontrola drobljenog kamenog agregata 00/31 od PR 1 km 0+000.00 do PR 8 km 0+168.95 i od PR 14 km 281.25 do PR 24 km 0+495.00, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-OP1-RIA-g050-R1.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
44		Deonica Rumenka Kisač - Saobraćajnica na km 89+315.15. Geodetska kontrola iskopa servisnog puta br.1 od km 0+000.00 do km 0+381.095, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-OP2-RIA-g083.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.

45		Deonica Rumenka Kisač - Saobraćajnica na km 89+315.15. Geodetska kontrola iskopa servisnog puta br.5 od km 0+000.00 do km 0+250.00, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-OP2-RIA-g084.	Pozicija nije spremna za kontrolu.
46		Otvorena pruga Kisač -Stepanovićevo. Geodetska kontrola ugrađenih temelja stubova žičane ograde od PR 637 km 92+275 do PR 682 km 93+400 - leva i desna strana, broj najave NSSU-S1.6-D1-SUB-FNC-RIA-g008.	Pozicija je geodetski snimljena.
47		Otvorena pruga Kisač -Stepanovićevo. Geodetska kontrola ugrađenih temelja stubova žičane ograde od PR 760 km 93+350 do PR 773 km 95+675 - leva i desna strana, broj najave NSSU-S1.6-D1-SUB-FNC-RIA-g009.	Pozicija je geodetski snimljena.
48		Otvorena pruga Kisač -Stepanovićevo. Geodetska kontrola ugrađenih temelja stubova žičane ograde od PR 779 km 95+825 do PR 807 km 96+525 - leva i desna strana, broj najave NSSU-S1.6-D1-SUB-FNC-RIA-g010.	Pozicija je geodetski snimljena.
49		Otvorena pruga Stepanovićevo - Zmajevo. Geodetska kontrola temeljne jame pre betoniranja temelja stuba žičane ograde od PR 881 km 98+275 do PR 967 km 100+400 - leva strana, broj najave NSSU-S1.8-D1-SUB-FNC-RIA-g023.	Pozicija je geodetski snimljena.
50		Otvorena pruga Stepanovićevo - Zmajevo. Geodetska kontrola temeljne jame pre betoniranja temelja stuba žičane ograde od PR 865 km 97+925 do PR 881 km 98+275 - leva i desna strana, broj najave NSSU-S1.8-D1-SUB-FNC-RIA-g025.	Pozicija nije spremna za kontrolu.
51		Otvorena pruga Stepanovićevo - Zmajevo. Geodetska kontrola temeljne jame pre betoniranja temelja stuba žičane ograde od PR 967 km 100+400 do PR 995 km 101+100 - leva strana, broj najave NSSU-S1.8-D1-SUB-FNC-RIA-g026.	Pozicija je geodetski snimljena.
52		Otvorena pruga Zmajevo - Vrbas. Geodetska kontrola ugrađenih temelja stubova žičane ograde od PR 1160 km 105+000 do PR 1243 km 107+000 - leva i desna strana, broj najave NSSU-S1.10-D1-SUB-FNC-RIA-g009.	Pozicija je geodetski snimljena.
53		Otvorena pruga Zmajevo - Vrbas. Geodetska kontrola ugrađenih temelja stubova žičane ograde od PR 1243 km 107+000 do PR 1323	Pozicija je geodetski snimljena.

		km 109+000 - leva i desna strana, broj najave NSSU-S1.10-D1-SUB-FNC-RIA-g010.	
54		Deonica Zmajevo Vrbas - Saobraćajnica na km 108+115,69, pristupni put objektu SS I TK. Geodetska kontrola završnog sloja nasipa - posteljica na pristupnom putu za SS I TK od km 0+020,00 do km 0+194,69, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-OP9-RIA-g053.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.

1.1.8 Radovi na termotehničkim i mašinskim instalacijama

Projekat termotehničkih instalacija – Stanična zgrada u železničkoj stanici Novi Sad.

- Izvode se radovi na termotehničkim instalacijama, u okviru prizemlja, 1. i 2. sprata krila „A“, prizemlja i 1. sprata krila „B“, kao i podruma krila „D“;
- U okviru prizemlja krila „A“, u hodniku prizemlja još nije završeno povezivanje fan coil uređaja sa PVC cevnom mrežom za odvod kodenzata. Radovi u zastoju;
- Završeno je postavljanje čeličnih nosača spoljašnjih jedinica rashladnog sistema i u završena je ugradnja spoljašnjih jedinica (svih 17 komada je postavljeno na nosače). U zastoju je povezivanje istih na cevnu mrežu, trenutno 10 od 17 jedinica je povezano. U prostoriji A0.21 postavljena je i druga od dve unutrašnje rashladne jedinica i iste povezane na cevnu mrežu;
- U prostoriji A0.15a, demontirane su unutrašnje rashladne jedinice, po nalogu elektro nadzora, zbog blizine razvodnih ormana. Definisani su novi položaji rashladnih jedinica, kao i odvod kodenzata, ali još nije izvršena ugradnja jedinica.
- Za prostorije A0.19 i A0.22 dopremljeni su klima ormani i istu su postavljeni na projektom određene pozicije i njihovo povezivanje na cevnu mrežu i kondenzat je u zastoju;
- U okviru 1. sprata krila „A“ završeni prodori cevne mreže fan coil uređaja. Završena je izrada mreže za odvod kondenzata. Završeno je povezivanje fan coil uređaja na cevnu mrežu. U prostorijama A1.22 i A1.25, Izvođač je greškom zamenio mesta fan coil uređajima i iste još nije postavio po projektu. Ove prostorije su i deo „NIIAS“ projekta i isti nije usaglašen sa projektom „CIP“. Nakon sastanka sa Projektantima dogovoreno je da „NIIAS“ koriguje svoj projekat. Dostavili su njihov predlog rešenja ali je isti vraćen sa strane Nadzora na ponovnu tehničku analizu. „NIIAS“ još uvek nije dostavio nikakav odgovor. Trenutno je zastoj na radovima.
- U toku je izrada ventilacionog sistema za toalete na prvom spratu, u blizini Velike sale. Izmena je dostavljena Nadzoru na odobrenje i ista je prihvaćena. Radovi su u zastoju;
- U Velikoj Sali su završeni radovi na izradi ventilacionih kanala i prodora do mašinske prostorije na 2. spratu (do mesta gde se planira ugradnja nove klima komore), ostalo je da se ugrade vrtložni difuzori. Takođe, u prostoriji A1.30 izvučena je cevna mreža od bakra za rashladni sistem, kao i kondenz mreža, i postavljene sve tri unutrašnje split jedinice i iste povezane na mrežu. U samoj Velikoj Sali postavljena je jedna parapetna rashladna jedinica i povezana na mrežu;
- Klima komore su postavljene u okviru mašinske prostorije na 2. spratu i trenutno je zastoj u radovima usled nedostatka napajanja, kako bi se ispitala automatika i elektro ormani. Takođe, u toku je izrada i ugradnja cevne mreže iz nove toplotne podstanice i njihovo povezivanje na komore.
- Isporučena je i nova klima komora za Veliku salu i u toku je njeno postavljanje i povezivanje;
- Izvršeno je postavljanje čilera na predviđeni temelj u nastavku krila „D“ i završeni su radovi na izvođenju instalacije radi povezivanja čilera i cevne mreže. Ostalo je da se završi termoizolacija cevi. Takođe nedostaje napajanje. Završeni su radovi na izgradnji čelične konstrukcije„kaveza“ čilera;
- U okviru krila „A“, ventilatori za izvlačenje vazduha su namontirani, potrebno je napajanje za ispitivanje i puštanje u rad.

- U prizemlju krila „B“, u okviru prodora kroz prostorije završena je ugradnja ventilacionih kanala, ostalo je samo da se ugrade rešetke. Radovi na cevnoj mreži grejanja, iz pravca krila „A“, su završeni do nove toplotne podstanice. Završeno je postavljanje fan coil uređaja, dok su u zastoju radovi na njihovom povezivanju;
- U vestibilu krila „B“ rešen je problem trase ventilacionog kanala za kafić ispod galerije, kao i trase cevne mreže za fan coil uređaje (isto za prostorije ispod galerije). Na dostavljena rešenja Projektanata data je saglasnost Nadzora, kao i usmeno odobrenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada. Završeni su radovi na izradi trase cevne mreže za fan coil uređaje, kao i postavljanje samih uređaja;
- Na 1. spratu krila „B“, kroz budući hodnik, izvode se radovi na ugradnji ventilacionog sistema, a u skladu sa zadnjim rešenjem Projektanta. Takođe, u prostorijama se izvodi ventilacioni sistem i ugradnja fan coil uređaja;
- Na 1. spratu krila „D“ u prostoriji D1.37a ugrađene su dve split klime, dok su spoljašnje jednice postavljene na krov krila „D“.
- U podrumu krila „D“ u prostorijama D0.05 i D0.08 ugrađene su po dve split klime, dok su spoljašnje jednice postavljene na krov krila „D“.
- U podrumu krila „D“ završeno je postavljanje termo-izolacije na čilerskom cevnom sistemu DN200. Završeno je i oblaganje limom;
- U budućoj toplotnoj podstanici završeno je 95% mašinskih radova na montaži nove mašinske opreme i povezivanje sa postojećom toplotnom podstanicom. Nije započet deo koji se odnosi na Veliku salu. Utvrđeno je da nisu harmonizovani elektro i mašinski projekti u delu za Veliku salu. Izvođač se obavezao da kontaktira elektro Projektanta i da reše problematiku. Izveden je sistem odvodnjavanja. Nedostaje napajanje i automatika, koji nisu u obimu posla mašinskih radova. Elektro radovi, koji su bili definisani projektom, su završeni ali ostaje problem za deo projekta Velike sale.

Projekat liftova u staničnoj zgradi u železničkoj stanici u Novom Sadu - Krilo A i Krilo B

- Završeni su radovi na ugradnji lifta L1 u okviru krila „A“. Urađeni su građevinski radovi na zatvaranju prostora između liftovskog okna i zgrade stanice. Određeni su položaji dodatnih pozivnih kutija kako bi se ispunili zahtevi standarda EN 81-70 i čeka se ugradnja istih.
- Nije izvedeno nastavljanje trake za uzemljenje, iza okna lifta.
- Privodi se kraju radovi na oblaganju spoljašnje strane liftovskog okna. Nije započeto oblaganje poda ispred ulaza;
- U okviru vestibila krila „B“, za lift L2, predloženo je sledeće:
  - Radovi na nivou prizemlja:
    - demontirati mermerne ploče i srušiti betonsku soklu oko lifta u vestibilu sa prednje strane, na liniji ulaznih vrata u lift. Ovo je urađeno, ali po celom obimu, a ne samo sa prednje strane;
    - izrada nove sokle koja treba da bude u ravni staklene fasade lifta - obavljeno;
    - Nabavka i ugradnja nove pozivne kutije, na levoj stranu u odnosu na ulaz u lift. Postojeća pozivna kutija, sa desne strane se zadržava.
  - Radovi na nivou međustanice-galerija:
    - demontirati 4 staklena panela-fasada lifta u nivou međustanice - obavljeno;
    - sečenje čelične grede (neposredno iznad nivoa poda međustanice), koja se nalazi na poziciji vrata lifta - obavljeno;
    - proveriti da li odgovara čelična greda koja se nalazi ispod nivoa poda međustanice, ukoliko ne odgovara potrebno je dodati novu čeličnu gredu - obavljeno;
    - skinuti čelični L profil koji se nalazi na gornjoj gredi - greda iznad vrata lifta, sa donje strane grede - obavljeno;

- skinuti oba L profila koji se nalaze na donjoj gredi - greda ispod vrata lifta - obavljeno;
- dodati vertikalni profil u zoni otvora za vrata lifta-ponoviti kao u prizemlju - obavljeno
- izraditi nedostajuću čeličnu konstrukciju poda međustanice i prednju strane lifta, s obzirom da postoji razmak od 60 cm;
- Ugraditi pozivnu kutiju sa leve strane u odnosu na ulazna vrata u lift;
- Ugradnja novih vrata – u toku su radovi

o Radovi na nivou sprata:
- Demontaža dela staklene ograde na mestu stepeništa koje povezuje galeriju i prvi sprat i izrada nove;
- Sečenje dela betonske grede između završnog gazišta stepeništa galerije i poda na spratu, koja je izdignuta u odnosu na kotu poda sprata;
- Nabavka i ugradnja nove pozivne kutije, na desnoj stranu u odnosu na ulaz u lift. Postojeća pozivna kutija, sa leve strane se zadržava.

- Projektant je dostavio dopunu projekta za nedostajuću konstrukciju galerije ispred lifta, ali radovi na istom nisu još započeti.

Projekat mašinskih instalacija – projekat liftova u pothodniku u železničkoj stanici u Novom Sadu

- Lift L1: pušten je u rad jer su zadovoljeni svi preduslovi za njegov rad.
- Lift L2: pušten je u rad jer su zadovoljeni svi preduslovi za njegov rad;
- Lift L3: pušten je u rad jer su zadovoljeni svi preduslovi za njegov rad;
- Lift L4: Izvedeni su montažno-instalaterski radovi. Urađeni su radovi na oblaganju oko okna lifta i na samom podu kabine. Na peronu, urađeno je oblaganje oko okna lifta, ostalo je samo ispod elektro ormana da se finalizuje. Završen je pregled od strane Imenovanog tela za bezbednost liftova i izdat je Sertifikat o završnoj kontroli, Izveštaj o ocenjivanju usaglašenosti i Deklaracija o usaglašenosti;
- Na svim liftovima, potrebna je završena obrada ivica između samih liftova i okana.
- Na peronima, završeni su ventilacioni otvori na samom liftovskom oknu (za odimljavanje u slučaju požara). Ostalo je da se postave zaštitna mreža na ulazu lula, radi sprečavanja ulaska ptica i insekata.

Projekat izmeštanja i zaštite gasovoda "NOVI SAD-GAS"

- **km 97+015 ÷ 97+034 (Stepanovićevo):**
  - Završeno je povezivanje novih i postojećih trasa gasovoda. Uklonjeni su delovi gasovoda u zoni izgradnje podvožnjaka.
  - Ostaje samo, nakon završetka izgradnje, da se utvdi da li privremena trasa gasovoda (u zoni od Ambulante do kraja parcele 582 KO Stepanovićevo) može ostati kao finalna trasa.

Projekat izmeštanja i zaštite gasovoda P.S. "TELEFONIJA" a.d. u stečaju

- Predata je ispravljena i dopunjena dokumentacija za izdavanje Rešenje o odobrenju izvođenja radova i čeka se izdavanje istog.
- Radovi na povezivanju postojećih i novoizvedenih trasa gasovoda su završeni.

Projekat mašinskih instalacija – projekat liftova u pothodniku TPS u Novom Sadu

- Lift L1 je ugrađen na svoju poziciju i radovi su završeni, ali sa nedostacima. Nisu završeni građevinski radovi. Nije završeno zatvaranje otvora na peronu gde je prvobitno planirano da bude elektro orman, kao i u pothodniku na prilazu liftu. U oknu lifta je dosta vode. Napajanje je dovedeno ali nije povezano, a uzemljenje nije ni dovedeno. Potrebno je ugraditi pozivnu kutiju na peronu zbog usaglašavanja sa standardom EN 81-70. Otvore za provetravanje je potrebno zaštititi žaluzinom i komarnikom. Lift nije dovoljno zaštićen od atmosferskih padavina.
- Lift L2 je ugrađen na svoju poziciju i radovi su završeni, ali sa nedostacima. Nisu završeni građevinski radovi. Nije završeno zatvaranje otvora na peronu gde je prvobitno planirano da bude elektro orman, kao i u pothodniku na prilazu liftu. Napajanje i uzemljenje je dovedeno, ali nije povezano. Otvore za provetravanje je potrebno zaštititi žaluzinom i komarnikom. Lift nije dovoljno zaštićen od atmosferskih padavina.
- Lift L3 je ugrađen na svoju poziciju i radovi su završeni, ali sa nedostacima. Nisu završeni građevinski radovi. Nije završeno zatvaranje otvora na peronu gde je prvobitno planirano da bude elektro orman, kao i u pothodniku na prilazu liftu. Napajanje i uzemljenje je dovedeno, ali nije povezano. Otvore za provetravanje je potrebno zaštititi žaluzinom i komarnikom. Lift nije dovoljno zaštićen od atmosferskih padavina.
- Ukinuto je obezbeđenje gradilišta, što otvara mogućnost nezakonitog otuđenja delova i opreme ugrađenih liftova.
- Završen je i pregled od strane Imenovanog tela za bezbednost liftova i izdat je Sertifikat o završnoj kontroli, Izveštaj o ocenjivanju usaglašenosti i Deklaracija o usaglašenosti.
- Poslat je dopis Izvođaču sa navedenim nedostacima.

Projekat mašinskih instalacija – projekat liftova u pothodniku Stepanovićevo

- Završeni su instalatersko-montažni radovi na ugradnji liftova L1 i L2.
- Lift L1 je ugrađen na svoju poziciju i radovi su završeni, ali sa nedostacima. Napajanje i uzemljenje lifta je izvedeno do lifta, ali nije još povezano. Elektro orman je postavljen na poziciju. Još uvek se izvode građevinski radovi na vetrobranima, tako da nije izvršena ni ugradnja pozivne kutije na istom, zbog usaglašavanja sa standardom EN 81-70. Nisu završeni građevinski radovi u pothodniku na prilazu liftu. Otvore za provetravanje je potrebno zaštititi žaluzinom i komarnikom.
- Lift L2 je ugrađen na svoju poziciju i radovi su završeni. Elektro orman je postavljen na poziciju. Napajanje i uzemljenje lifta je izvedeno do lifta, ali nije još povezano. Još nisu završeni građevinski radovi na prilazima lifta na peronu i međustanici. Takođe ni vetrobrani nisu još uvek postavljeni, tako da nije izvršena ni ugradnja pozivne kutije na istom. Nisu završeni građevinski radovi u pothodniku na prilazu liftu. Otvore za provetravanje je potrebno zaštititi žaluzinom i komarnikom.
- Poslat je dopis Izvođaču sa navedenim nedostacima.

Projekat mašinskih instalacija – projekat liftova u pothodniku Zmajevo

- Lift L1 je ugrađen na svoju poziciju i radovi su završeni, ali sa nedostacima. Napajanje i uzemljenje lifta je izvedeno do lifta, ali nije još povezano. Elektro orman je postavljen na poziciju. Još uvek se izvode građevinski radovi na vetrobranima, tako da nije izvršena ni ugradnja pozivne kutije na istom, zbog usaglašavanja sa standardom EN 81-70. Nisu završeni građevinski radovi u pothodniku na prilazu liftu. Otvore za provetravanje je potrebno zaštititi žaluzinom i komarnikom.
- Lift L2 je ugrađen na svoju poziciju i radovi su završeni, ali sa nedostacima. Napajanje je dovedeno do lifta ali nije povezano, a uzemljenje nije ni dovedeno. Elektro orman je postavljen na poziciju. Još uvek se izvode građevinski radovi na vetrobranima, tako da nije izvršena ni ugradnja pozivne kutije na istom, zbog usaglašavanja sa standardom EN 81-70. Nisu završeni građevinski radovi u pothodniku na prilazu liftu. Otvore za provetravanje je potrebno zaštititi žaluzinom i komarnikom.
- Završen je i pregled od strane Imenovanog tela za bezbednost liftova i izdat je Sertifikat o završnoj kontroli, Izveštaj o ocenjivanju usaglašenosti i Deklaracija o usaglašenosti.

- Poslat je dopis Izvođaču sa navedenim nedostacima.

Projekat mašinskih instalacija – projekat liftova u pothodniku Kisač

- Lift L1 je ugrađen na svoju poziciju i radovi su završeni, ali sa nedostacima. Napajanje i uzemljenje lifta je izvedeno do lifta i isti su povezani. Elektro orman je postavljen na poziciju. Ugrađena je pozivna kutija u pothodniku i usklađena je sa standardom EN 81-70, kao i pozivna kutija na štoku lifta na peronu. Nije izvršena ugradnja pozivne kutije na vetrobranu, zbog usaglašavanja sa standardom EN 81-70. Nisu završeni građevinski radovi u pothodniku na prilazu liftu. Otvore za provetravanje je potrebno zaštititi žaluzinom i komarnikom. Prilikom sertifikacije ustanovljeni su problemi sa kočnicom koji će naknadno biti otklonjeni.
- Lift L2 je ugrađen na svoju poziciju i radovi su završeni, ali sa nedostacima. Napajanje je dovedeno do lifta ali nije povezano, a uzemljenje nije ni dovedeno. Elektro orman je postavljen na poziciju. Ugrađena je pozivna kutija u pothodniku i usklađena je sa standardom EN 81-70, kao i pozivna kutija na štoku lifta na peronu. Nije izvršena ugradnja pozivne kutije na vetrobranu, zbog usaglašavanja sa standardom EN 81-70. Nisu završeni građevinski radovi u pothodniku na prilazu liftu. Otvore za provetravanje je potrebno zaštititi žaluzinom i komarnikom. U oknu postoji voda.
- Završen je i pregled od strane Imenovanog tela za bezbednost liftova i izdat je Sertifikat o završnoj kontroli, Izveštaj o ocenjivanju usaglašenosti i Deklaracija o usaglašenosti.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Sajlovo

- Završeni su pripremni/grubi radovi na termotehničkim instalacijama. Postavljeni su nosači, formirani otvori u zidovima za bakarne cevi i za odvod kondenzata. Čeka se isporuka opreme za klimatizaciju.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Rumenka

- Završeni su pripremni/grubi radovi na termotehničkim instalacijama. Postavljeni su nosači, formirani otvori u zidovima za bakarne cevi i za odvod kondenzata. Čeka se isporuka opreme za klimatizaciju.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Kisač

- Postavljeni su nosači, formirani otvori u zidovima za bakarne cevi i za odvod kondenzata. Takođe, završena je ugradnja svih unutrašnjih jedinica split sistema i 1 spoljašnja.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Zmajevo

- Završeni su pripremni/grubi radovi na termotehničkim instalacijama. Postavljeni su nosači, formirani otvori u zidovima za bakarne cevi i za odvod kondenzata. Čeka se isporuka opreme za klimatizaciju.

1.1.9 Mostovi i inženjerske konstrukcije

GALERIJA NA KM 78+377,03

- U toku je sanacija prslina.

MOST NA KM 0+796

- U toku je rušenje mosta.

Nadvožnjak na km 84+809,19

- U toku je priprema površina betona pre nanošenja hidrofobnog premaza.

Nadvožnjak na km 89+315

- U toku je asfaltiranje nadvožnjaka.

Podvožnjak na km 89+984,34

- Završena je izrada hidroizolacije (bitumenskih traka)

Nadvožnjak na km 92+768,08

- Završeno je postavljanje pešačke ograde.

NADVOŽNJAK NA KM 95+739

- Postavljeni su pokrivni limovi na mestima dilatacija.

PODVOŽNJAK NA KM 97+027,31

- U toku je priprema površina zidova podvožnjaka za nanošenje hidrofobnog premaza.

NADVOŽNJAK NA KM 98+149

- U toku je priprema površina za nanošenje hidrofobnog premaza.

Most na km 101+132,33

- U toku priprema površine AB kolovozne ploče za nanošenje MMA hidroizolacije.
- U toku je priprema površina za nanošenje hidrofobnog premaza.

NADVOŽNJAK NA KM 105+797,12

- Završena je izrada MMA hidroizolacije kolovozne ploče.
- Završeno je postavljanje pešačke ograde.

NADVOŽNJAK NA KM108+115

- Završena je izrada MMA hidroizolacije kolovozne ploče.

NAPREDAK RADOVA NA GSMR STUBOVIMA

STANICA NOVI SAD (km 77+077.35)

- Postavljena je ograda.

SAJLOVO (km 80+650.91)

- Postavljena je ograda.

RUMENKA (km 84+072.57)

- Postavljena je ograda.

KISAČ (km 90+437.91)

- Postavljena je ograda.

STEPANOVIĆEVO (km 97+081.35)

- Postavljena je ograda.

ZMAJEVO (km 102+481.62)

- Postavljena je ograda.

BAČKO DOBRO POLJE (km 108+115,69)

- Postavljena je ograda.

NAPREDAK RADOVA NA ZIDOVIMA PROTIV BUKE

- U toku je sanacija oštećenja armirano betonskih talpi I HEA stubova.
- Završena je montaža apsorbcionih panela na zidovima broj 2, 3, 4, 5 , 6, 7.
- U toku je montaža apsorbcionih panela na zidovima broj 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

1.2 Radovi na deonici Vrbas (ulaz) – Naumovićevo (ulaz)

1.2.1 Radovi u infrastrukturnim objektima u službenim mestima

STANICA VRBAS

Stanična zgrada na km 113+610.13

- Završena je izrada konstrukcije objekta
- U toku je izvođenje arhitektonskih radova

Pothodnik na km 113+610.13

- U toku je izrada konstrukcije nadstrešnica nad pothodnikom

Peronski zidovi

- Završeno je betoniranje peronskih zidova (u toku je polaganje behaton kocki)

Peronske nadstrešnice

- Završena je izrada konstrukcije nadstrešnice
- U toku je izvođenje arhitektonskih radova

TK okna

- U toku je izvođenje završnih radova na tk oknima.

SS TK Vrbas

- Završena je izrada konstrukcije objekta

EVP Vrbas km 119+480

- Završena je izrada hidroizolacije tankvane transformatora
- Završeno je betoniranje temelja ograde spoljnog postrojenja

TK objekat (Vrbas Nova)

- Završena je izrada konstrukcije objekta

Vrbas atar TK objekat

- Završeno je izvođenje radova na izradi konstrukciji objekta

STANICA LOVĆENAC

Pothodnik na km 129+485

- Izvršen je fabrički prijem konstrukcije nadstrešnice
- U toku je izrada štampanog betona

TK okna

- U toku je izvođenje završnih radova
- Stepen završenosti tk okana u stanici Lovćenac mali Iđoš je 95%

Peronski zidovi

- Radovi nisu izvođeni
- Preostali radovi: izrada habajućeg sloja izrada behatona

Peronske nadstrešnice

- Završeno je betoniranje temelja nadstrešnica

Peronske ograde

- Završeno je betoniranje temelja peronskih ograda

SS TK

- Završena je izrada konstrukcije objekta

MALI IĐOŠ

PS Mali Iđoš

- Završena je izrada konstrukcije objekta
- U toku je izvođenje arhitektonskih radova

TK objekat

- Završena izrada konstrukcije objekta

STANICA BAČKA TOPOLA

Pothodnik na km 143+504

- Završeni radovi na izradi konstrukcije objekta
- U toku je izrada štampanog betona
- Izvršen je fabrički prijem konstrukcije nadstrešnice

SS i TK objekat

- Završena je izrada konstrukcije objekta

Vojna rampa na km 143+100

- U toku je nasipanje objekta

TK okna

- U toku su radovi (izrada podložnog betona, izrada hidroizolacije donje ploče, izrada armature zidova, obziđivanje kao zaštita hidroizolacije) na tk oknima 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 22a, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
- Stepen završenosti tk okana u stanici Bačka Topola je 97%

Peronski zidovi

- Završeno je betoniranje pristupne rampe

Peronske ograde i temelji signalizacije

- U toku je betoniranje temelja signalizacije

Betonska konstrukcija vage

- Završena je montaža vage

PSN Bačka Topola

- Završena je izrada konstrukcije objekta

MALI BEOGRAD

TK objekat

- Završena je izrada konstrukcije objekta

STANICA ŽEDNIK

Pothodnik na km 157+139

- Izvršen prijem konstrukcije nadstrešnice u pogonu
- Nadstrešnica je dopremljena na gradilište
- U toku su pripremni radovi na montaži nadstrešnice

PS Žednik

- Završena je izrada konstrukcije objekta

SS i TK objekat

- Završena je izrada konstrukcije objekta
- U toku je izrada armature i oplate temelja dizel agregata

TK okna

- U toku je izrada završnih radova tk okana
- Stepen završenosti tk okana u stanici Žednik je 98%

Peronski zidovi

- U toku je izrada behaton ploča prilaznih rampi
- U toku je montaža peronskih nadstrešnica

<u>VERUŠIĆ</u>

TK objekat

- Završena je izrada konstrukcije objekta

TKKO okna (TKKo okna duž trase TKKO25-TKKO76)

- U toku su završni radovi na izradi tkk okana
- Stepen završenosti tkko okana je 97%

Arhitektonski radovi

MALI IĐOŠ

<u>SS i TK sa otpravnikom u Malom Idjošu (129+522)</u>

- Nastavak polaganje podne keramike

<u>Pothodnika sa nadstešnica u Malom Idjošu (129+485)</u>

- Izrada štampanog betona na kućištu liftova i parapetnim zidovima ispred lifta
- Izrada štampanog betona u pothodniku-završeno
- Šalovanje stepeništa pothodnika za izradu štampanog betona

PS u Malom Idjošu (129+636)

- Završetak izrada termoizolacije na fasadi sa ulične strane
- Izrada termoizolacije na fasadi sa bočnih strana

Obilazak gradilišta Tipskog TK objekta u Malom Idjošu (km 135+717)

- Završeno oblaganje fasade opekarskim listelama preko metalne mrežic
- Montaža čelične potkonstrukcije za fasadu od rebrastog lima – poleđina zgrade
- Montaža okapnica od lima iznad sokle-donji deo fasade od rebrastog lima

1.2.2 Radovi na donjem stroju

Otvorena pruga Vrbas Nova - Lovćenac (km 112+982.71 - km 128+849.48)

- Čišćenje terena i sečenje drveća.
- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.
- Široki iskop i iskop stepenica.
- Uređenje podtla i posteljice.
- Izrada nasipa.
- Izrada sloja ojačanja (geotekstil, geomreža i zamenski sloj-pružni kamen 31.5/63 mm i pesak).
- Izrada prelaznog sloja.
- Izrada zaštitnog sloja.

Otvorena pruga Lovćenac-Mali Iđoš - Bačka Topola (km 128+849.48- km 144+327.41)

- Čišćenje terena i sečenje drveća.
- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.
- Široki iskop.
- Uređenje podtla i posteljice.
- Izrada nasipa.
- Izrada sloja ojačanja (geotekstil, geomreža i zamenski sloj-kamen 0/100 mm i pesak).
- Izrada prelaznog sloja
- Izrada zaštitnog sloja.

Otvorena pruga Bačka Topola – Žednik (km 144+327.41- km 157+500.66)

- Čišćenje terena i sečenje drveća.
- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.
- Široki iskop.
- Uređenje podtla.
- Izrada nasipa.
- Izrada sloja ojačanja (geotekstil, geomreža i zamenski sloj-pružni kamen 31.5/63 mm i pesak).
- Izrada prelaznog sloja

- Izrada zaštitnog sloja.

<u>Otvorena pruga Žednik – Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+943.07)</u>

- Čišćenje terena i sečenje drveća.
- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.
- Široki iskop.
- Uređenje podtla.
- Izrada nasipa.
- Izrada sloja ojačanja (geotekstil, geomreža i zamenski sloj-pružni kamen 31.5/63 mm i pesak).
- Izrada prelaznog sloja.
- Izrada zaštitnog sloja.

Otvorena pruga Vrbas Nova - Lovćenac (km 112+982.71 - km 128+849.48)

Km 116+400 – Km 116+425, inicijalni zaštitni sloj~KK, pred vrbaški vijadukt

Otvorena pruga Lovćenac-B.Topola (km 128+849.48-km 144+327.41)

Km 131+575 – Km 131+245, geomat u iđoškom useku pred vijadukt~DIS

Km 143+126, desna strana, pristupni put pretovarnoj rampi-posteljica~EAT

Otvorena pruga Bačka Topola – Žednik (km 144+327.41- km 157+500.66)

Km 155+025 ekodukt, desna strana-geotekstil~EAT

Km 157+444 denivelacija, servisni piut 3, geotekstil~EAT

Izvršena su geomehanička ispitivanja i u skladu sa rezultatima merenja izvršen je prijem podtla i izvedenih slojeva nasipana na sledećim deonicama:

- Podtlo:
  -
- Nasip:
  -
- Prelazni sloj:
  -
- Zaštitni sloj:
  - Km 116+375 – Km 116+425

1.2.3 Radovi na gornjem stroju

Radovi na deonici OP Vrbas Nova – Lovćenac:

- Predbalastiranje levog i desnog koloseka od km114+650 - km114+800; km119+500-km119+550
- Polaganje betonskih pragova levog koloseka km114+427.568-km114+900
- Polaganje betonskih pragova desnog koloseka km114+494.068-km114+928
- Polaganje betonskih pragova levog i desnog koloseka od km115+000-km116+375
- Polaganje betonskih pragova levog i desnog koloseka od km119+500-km120+500
- Polaganje betonskih pragova levog koloseka km119+600-km121+900
- Polaganje levog koloseka km121+300-km122+550
- Polaganje levog koloseka CPG mašinom km114+489.108-km115+738.6
- Mašinsko regulisanje desnog koloseka prvi put (km114+200-km114+380).
- Mašinsko regulisanje levog koloseka prvi put (km114+250-km114+450).
  Dinamička stabilizacija desnog koloseka prvi i drugi put (km114+200-km114+380).
- Dinamička stabilizacija levog koloseka prvi i drugi put (km114+250-km114+450).

Radovi u stanici Lovćenac (Mali Iđoš):

- AT zavarivanje sa otpuštanjem napona na skretnicama broj 1 i 2
- AT zavaruvanje skretnice br 10 – 8 varova
- ET zavarivanje na kolosecima br 2 i 3
- Otpuštanje napona na kolosecima br 2 i 3 - km129+044.418-km129+644.418
- Otpuštanje koloseka br. 3 (glavni levi) km129+644.418-km129+947
- Otpuštanje koloseka br. 2 (glavni desni) km129+644.418-km129+947;

Radovi na deonici OP Lovćenac - Bačka Topola:

- Otpuštanje napona sa završnim zavarivanjem levog koloseka km134+643-km136+892; km133+144-km134+643, km132+394-km133+144
- Otpuštanje napona na levom koloseku km130+145-km132+394
- ET zavarivanje levog koloseka od km133+144-km135+393 – 12 varova, km134+643-km136+892 – 14 varova.

Radovi u stanici Bačka Topola:

- Polaganje i mašinsko regulisanje koloseka :
  - 12.453m (60E1) između skretnica br 1 i 2
  - 12.453m (60E1) između skretnica br 3 i 4
  - 12.453m (60E1) između skretnica br 20 i 21
  - 12.453m (60E1) između skretnica br 22 i 23
  - 12.212m (49E1) između skretnica br 8 i 9

- 15m (60E1-49E1) između skretnica br 5 i 11
- 15m (60E1-49E1) između skretnica br 8 i 12
- 10.426m (60E1-49E1) između skretnica br 13 i 16
- 12.212m (60E1-49E1) između skretnica br 14 i 15

- Mašinsko regulisanje skretnica br. 1, 2, 3, 4, 6 i 7

Radovi na deonici OP Bačka Topola-Žednik:

- Uređenje zastorne prizme levog i desnog koloseka od km 146+855 do km 147+330; km 147+330 – km 147+680; km 148+205 - km 147+680; km 148+205 - km 148+280 i km 149+130 - km 148+280

Radovi u stanici Žednik:

- AT zavarivanje skretnica br. 1, 2 i 5
- Ugradnja sprava protiv podužnog pomeranja šina – kolosek br. 5 – 74 kom
- Ugradnja sprava protiv bočnog pomeranja šina – kolosek br. 5 – 8+85 kom

Radovi na deonici OP Žednik – Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+943.07):

- Uređenje zastorne prizme levog i desnog koloseka od km 164+159 - km 164+634

Deponovani betonski pragovi - podvoznjak km118+708

Deponovani betonski pragovi km119+200

Nadvoznjak - Km120+570 - polozeni i deponovani betonski pragovi

Nadvoznjak - Km120+570 - polozeni i deponovani betonski pragovi

Stanica Vrbas Nova - km114+550

Stanica Vrbas Nova – položen levi vezni kolosek

Stanica Vrbas Nova - deponovani betonski pragovi (km114+500-km116+375)

Ugradnja sprava protiv bočnog pomeranja – kolosek br. 5 stanica Žednik

Elastomerni tepih postavljen na galeriji na km114+700

Predbalastiranje na galeriji na km114+700

Nasut predbalast preko galerije na km114+700

Nepropisno skladištenje materijala

Stanica Bačka Topola – ulaz

Kolosek „GEBI“

1.2.4 Radovi na kontaktnoj mreži i elektro-energetskim postrojenjima

RTU Lovćenac:

- Iskop rova za polaganje kablova za rastavljače KM.

RTU Vrbas:

- Polaganje kablova za rastavljače KM.

EVP Vrbas:

- Polaganje kablova za opremu u postrojenju.

Radovi na kontaktnoj mreži

1. **Stanica Vrbas (nova):**
   - **km 112+750 – km 114+600:**
     - zatezanje obostrano na 11 stubova (11, 17, 18, 22, 25, 26, 77, 78, 83, 84, 91);
     - montaža vođica na skretnici (22, 13);
     - fina regulacija KM na zateznim poljima 4-1 (1-34), D1 (11-22), 3-1 (35-84), 2 (55-108);
     - montaža strujnih veza na zateznim poljima 4-1 (17 kom), D1 (4 kom), 3-1 (14 kom), 2 (12 kom);
     - montaža žica protiv vetra na zateznim poljima 4-1 (15 kom), D1 (2 kom), 3-1 (14 kom), 2 (12 kom);
   - **km 112+700 – km 114+650:**
     - regulacija prema vrednosti AB (94, 95, 107, 108, 110); montaža strujnih veza (85, 90, 104);
     - regulacija KM na zateznim poljima 3-1, 4-1, 2, 6, 1; montaža strujnih veza na zateznim poljima 3-1 (13 kom), 6 (13 kom), 2 (11 kom);
     - montaža žica protiv vetra na zateznim poljima 3-1 (13 kom), 6 (13 kom), 2 (11 kom);
     - montaža 4 vođice tegova na skretnicama, završetak regulacije KM na skretnicama 1, 2, 3, 4, 6, 8;
     - montaža strujnih veza (4, 7, 11, 26, 74, 75, 79, 79-1, 84, 91);
     - montaža umetnutih izolatora na 4 mesta izolovanog preklopa na zateznim poljima 4-1 i 3-1 (6, 5, 4, 3);
     - montaža 1 sekcionog izolatora na zateznom polju D1;
     - regulacija KM (poligonacija, sistemska visina) na zateznim poljima 1 i 5;
     - montaža žica protiv vetra na zateznim poljima 1 (17 kom) i 5 (26 kom);
     - montaža strujnih veza na zateznim poljima 1 (17 kom), 5 (26 kom);
     - montaža 2 rastavljača i priključne veze (3, 8).
2. **Stanica Lovćenac:**
   - **km 128+400 – km 145+500:**
     - montaža stezaljki za povratni vod na 2 zatezna polja (1 (43 kom), 2 (43 kom)).
3. **OP Lovćenac – Bačka Topola:**

- **km 142+200 – km 144+327:**
  - razvlačenje povratnog voda na 2 zatezna polja (1 (1574 m), 2 (1567 m));
  - montaža stezaljki za povratni vod na 2 zatezna polja (1 (36 kom), 2 (36 kom));
  - razvlačenje obilaznog voda na 2 zatezna polja (1 (1515 m), 2 (1500 m)).

4. **Stanica Bačka Topola:**
   - **km 142+700 – km 144+327 i km 144+327 – km 145+600:**
     - razvlačenje povratnogg voda na 2 zatezna polja (3 (746 m) i 4 (751 m));
     - montaža stezaljki povratnog voda na 2 zatezna polja (3 (17 kom), 4 (17 kom));
     - razvlačenje obilaznog voda na 2 zatezna polja (5 (1670 m) i 6 (1653 m)).
5. **OP Bačka Topola – Žednik:**
   - **km 142+500 – km 157+800:**
     - montaža stezaljki za obilazni vod na zateznim poljima 1 (32 kom), 2 (32 kom), 5 (36 kom), 6 (36 kom);
     - montaža stezaljki za ramove povratnog voda na zateznim poljima 3 (2 kom) i 4 (2 kom);
     - montaža 14 nosača opreme (50-51 (2 kom), 53-54 (2 kom), 55-56 (3 kom), 57-58 (4 kom), 66-67 (3 kom)).
6. **Stanica Žednik:**
   - **km 142+500 – km 157+800:**
     - montaža nosača poligonatora na 9 zateznih polja (2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 1, 4, 5, D1, D2).

1.2.5 Radovi na SS i TK sistemima

U izveštajnom periodu izvođeni su sledeći radovi:
- Vrbas - polaganje signalnog kabla, postavljeni signali, montirana kablovska glava, montirani razvodni i orman sistema za grejanje skretnica, rađeno ranžiranje kablova za spolju i unutrašnju signalnu opremu i drugi radovi. Danas su praktično završeni radovi.
- Položeni signalni kablovi i podignuti signali na stanicama Lovćenac i Bačka Topola.
- Ranžirana je spoljašnja signalna oprema u stanici Naumovićevo.

Na deonici između Novog Sada i Kelebije u izveštajnom period nastavljeni su radovi na postavljanju SS/TK prodora.

Sledeća tabela pokazuje procenat izvršenja prodora:

Section 2：VRBAS NOVA-NAUMOVICEVO	
Quantity	221
Quantity completed	221
Percent complete	**100%**

1.2.6 Radovi na hidrotehničkim instalacijama

Pri kraju su radovi na izradi AB šahta za smeštaj protivpožarnih pumpi i vodomernog šahta ispred stanične zgrade Vrbas Nova

Pri kraju su radovi na priključku slivnika za odvodnju pristupne saobraćajnice staničnoj zgradi Vrbas Nova.

U toku je imontaža kanalica za odvodnjavanje perona u stanici Vrbas Nova
Intenzivirani su radovi na iskopu i oblaganju dna šljunkom upojnih polja na delu od km 129 do km 142
U toku su radovi na izmeštanju instalacija fekalne i atmosferske kanalizacije u ul. Glavna u reonu podvožnjka na km 143+729

1.2.7 Geodetski radovi

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		NSSU-S2-D2-STR-OP18-RIA-g14840 Nadvožnjak na km 152+282,46 Geodetski prijem oplate prelazne ploče S8	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja **RIA OD 07.04.2024.** **KONTROLISANO 07.04.2024.** **IZVOĐAČ NIJE DOSTAVIO RIU NA VREME**
2		NSSU-S2-D2-SUB-RIA-g6419 Pristupni put pretovarnoj rampi I parking za kamione na km 143+126,05 - km 0+200,00 - km 0+650,00 Podtlo - Geodetska ispitivanja	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
3		NSSU-S1-D2-STR-OP10-RIA-g585 Projekat nadvožnjaka na km 120+571 Kontrola oplate ivicnog venca I pesacke staze u delu od S5-S8	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
4		NSSU-S2-D2-STR-OP18-RIA-g14852 Nadvožnjak na km 152+282,46 Geodetski prijem oplate pešačke staze kampade S8	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja **POGREŠAN OPIS POZICIJE, RADI SE O PEŠAČKIM STAZAMA NA OBALNOM STUBU S8**
5		NSSU-S2-D2-SUB-RIA-g6433 Prelaz za životinje na km 155+025,00 - leva strana	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

		Geodetska kontrola izvedenog nasipa - Geodetska ispitivanja	
6		NSSU-S2-D2-SUB-RIA-g6475 Pristupni put za stanicu Lovćenac-Mali Iđoš na km 129+495,66 - km 2+300,00 - km 2+600,00 Podtlo - Geodetska ispitivanja	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja **RIA OD 11.04.2024.**
7		NSSU-S1-D2-STR-OCS-ST6EVP-RIA-g099-R1 ETS Vrbas km 119+480 Geodetski prijem izvedene oplate temeljne trake spoljne ograde	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
8		NSSU-S1-D2-STR-ST6-LPF-RIA-g010 Železnička stanica Vrbas(new) (stacionaža km 113+410-km 113+810) Geodetski prijem izvedenih ankera ankera i oplate temelja stubova rasvete(stubovi br. 77, 78)	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
9		NSSU-S2-D2-SUB-RIA-g6487 from km 143+126.05 do 143+257.8 Geodetsko snimanje zaštitnog sloja-industrijski kolosek	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
10		NSSU-S2-D2-SUB-RIA-g6490 Pristupni put za stanicu Lovćenac-Mali Iđoš na km 129+495,66 - km 2+250,00 - km 2+300,00 Podtlo - Geodetska ispitivanja	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
11		NSSU-S2-D2-SUB-RIA-g6492 Pristupni put za stanicu Lovćenac-Mali Iđoš na km 129+495,66 - km 2+600,00 - km 2+700,00 Podtlo - Geodetska ispitivanja	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja **PRIMLJENO 50 m VIŠE DO 2+750**
12		NSSU-S2-D2-STR-OP18-RIA-g14957 Nadvožnjak na km 152+282,46 Geodetski prijem oplate prelazne ploče S1	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

1.2.8 Radovi na termotehničkim i mašinskim instalacijama

Projekat izmeštanja i zaštite gasovoda JP "VRBAS-GAS"

- **km 116+905.**
  - U zoni stubnog mesta 14 previđena je izgradnja privremene devijacije puta.
  - Radovi na zaštiti su kompletno izvedeni. Nedostaje pismena saglasnost "Vrbas gas"-a na projekat.

Projekat izmeštanja i zaštite gasovoda "BEOGAS" d.o.o.

- Na stacionaži km 142+604, Izvođač je završio izmeštanje desne (istočne) odušne cevi na rastojanju od 8m od ose zadnjeg ind. koloseka.

Projekat termotehničkih instalacija – Stanična zgrada u železničkoj stanici Bačka Topola

- Završeni su radovi na ugradnji grejnih tela i cevne mreže sistema grejanja, kao i ugradnja unutrašnjih rashladnih jedinica Usled promene položaja elektro kotla, izvedeno je i napajanje do novopostavljenog mesta. Takođe, nakon završnih građ. radova, vraćeni su i radijatori. Završeno je i povezivanje komunikacijskog kabla između unutrašnjih i spoljašnjih rashladnih jedinica. Potrebno je izvršiti ispitivanje funkcionalnosti sistema grejanja, ali se čeka da se voda i struja dovedu do objekta. Takođe, ostaje punjenje freonom rashladnog sistema.

Projekat termotehničkih instalacija – Stanična zgrada u železničkoj stanici Vrbas Nova

- Izvedeni su radovi na ugradnji cevne mreže sistema hlađenja i grejanja, kao i trase za odvod kodenzata, do nivoa koliko dozvoljavaju trenutni AG radovi. Završeni su i radovi na ugradnji mreže cevi za podno grejanje.
- Završena je i ugradnja opreme i uređaja sistema hlađenja. Uređaji su povezani na cevnu mrežu, dok je kondenzat povezan u prizemlju, a na spratu još uvek nije. Takođe, u toku su završni radovi na ugradnji ventilacionog sistema u smislu ugradnje samih ventila.
- Ostalo je da se ugradi elektro kotao i ekspanziona posuda.
- Potrebno je izvršiti ispitivanje funkcionalnosti sistema grejanja i punjenje freonom rashladnog sistema.

Projekat mašinskih instalacija – projekat liftova u pothodniku Vrbas Nova

- Usled problema sa rokom isporuke lifta za stanicu Subotica, izvršena je ugradnja samo jednog lifta na stanici Vrbas Nova i to lift L1. Ostala dva lifta su predviđena za ugradnju u Subotici;
- Lift L1 je ugrađen na svoju poziciju i radovi su završeni, ali sa nedostacima.
- Napajanje i uzemljenje lifta je izvedeno do lifta i isti su nisu povezani. Elektro orman je postavljen na poziciju. Ugrađena je pozivna kutija u pothodniku i usklađena je sa standardom EN 81-70, kao i pozivna kutija na štoku lifta na peronu. Nije izvršena ugradnja pozivne kutije na vetrobranu, jer su još uvek radovi na istoj. Nisu završeni građevinski radovi u pothodniku na prilazu liftu, kao i na peronu. Otvore za provetravanje je potrebno zaštititi žaluzinom i komarnikom.
- Izvršena je sertifikacija lifta sa pomoćnim napajanjem, ali sve funkcije lifta nisu radile sa pomoćnim napajanjem.

Projekat mašinskih instalacija – projekat liftova u pothodniku Žednik

- U toku je montaža liftova L1 i L2. Završetak radova se očekuje sledeće nedelje.

Mašinsko tehnološki projekat vaga

- Završeni su građevinski radovi na izradi temelja vage u Bačkoj Topoli.
- Takođe završena je i ugradnja iste. Ostala je montaža ostale merne opreme, ali nakon postavljanja šina na samoj vagi. Takođe, potrebno je izraditi i vagarsku kućicu i za istu je poslat dopis Izvođaču.
- Investitor je odustao od vage u Žedniku.

1.2.9 Mostovi i inženjerske konstrukcije

<u>Propust na km 0+569,88 (levi vezni)</u>

- Postavljanje elastomernog tepiha.

<u>Galerija na km 114+716,45</u>

- Izrada MMA hidroizolacije na ploči galerije.

<u>Vijadukt na km 117+155,43</u>

- Izrada MMA hidroizolacije.
- Betoniranje zaštite MMA hidroizolacije.
- Betoniranje dilatacionih spojnica.
- Betoniranje temelja kegle P43.
- Priprema i farbanje čelične konstrukcije.

Nadvožnjak na km 120+571,30

- Montaža skele za oplatu ivičnog venca.

Nadvožnjak na km 125+191,62

- Betoniranje pešačkih staza.

Nadvožnjak na km 126+976,09

- Betoniranje pešačke staze.

Nadvožnjak na km 137+300,00 (Ecoduct)

- Iskop za temelje ograde.

Nadvožnjak na km 139+003,02

- Priprema površina za farbanje betona.
- Farbanje raspona S4-S5.

143+729,21 km – Podvožnjak

- Postavljanje ograde na zidovima podvožnjaka
- Čišćenje i brušenje zidova

147+137,33 km – Nadvožnjak

- Izrada asfalta kolovozne ploče 1. sloj
- Izrada podlivki stopa zaštitne ograde

- Izrada asfalta kolovozne ploče 2. sloj



<u>152+282,46 km – Nadvožnjak</u>

- Postavljanje armature i oplate konzole krila sa leve i desne strane na S8
- Montaža ivičnjaka na krilima S8
- Montaža armature i oplate ivičnog venca pešačke staze na krilima S8
- Betoniranje ivičnog venca pešačke staze na krilima S8
- Čišćenje površine kolovozne ploče
- Betoniranje klinastog nasipa na prelaznoj ploči
- Izrada asfalta kolovozne ploče S1 – S8 1. sloj
- Betoniranje podložnog betona prelazne ploče na S1
- Izrada podlivki stopa zaštitne ograde
- Montaža armature i oplate prelazne ploče S1

<u>155+025,00 km – Ekodukt</u>

- Izrada ček listi radova koje treba popraviti
- Čišćenje i brušenje gornje površine ljuske sa spoljne strane
- Nasipanje i nabijanje kamenog agregata sa leve strane objekta
- Čišćenje i brušenje gornje površine ljuske sa spoljne strane
- Peskarenje gornje površine ljuske
- Sanacija loših mesta na gornjoj površini ljuske

Kontaktna mreža

PZI	Lokacija	Ukupno stubova	Ukupno podignutih stubova	%	Ukupno stubova portala	Ukupno podignutih stubova portala	%
4/1.1.11	Stanica Vrbas (nova)	117	107	91.5%	8	8	100.0%
4/1.1.12	Stanica Vrbas	68	48	70.6%	36	0	0.0%
4/1.1.13	OP Vrbas (nova) – Lovćenac	562	465	82.7%	6	0	
4/1.1.14	Stanica Lovćenac	74	74	100.0%	18	16	77.8%
4/1.1.15	OP Lovćenac – Bač. Topola	416	414	99.5%	0	0	
4/1.1.16	Stanica Bačka Topola	121	116	95.9%	24	24	83.3%
4/1.1.17	OP Bačka Topola – Žednik	388	383	98.7%	0	0	
4/1.1.18	Stanica Žednik	86	86	100.0%	16	12	75.0%
4/1.1.19	OP Žednik – Naumovićevo	312	311	99.7%	0	0	
4/1.1.20	Stanica Naumovićevo	95	94	98.9%	22	18	81.8%
4/1.1.21	OP Naumovićevo – Subotica	310	226	72.9%	6	0	
4/1.1.22	Stanica Subotica	181	65	35.9%	268	109	40.7%
4/1.1.23	OP Subotica – drž. granica	246	198	80.5%	4	0	0.0%
∑		**2976**	**2587**	**86.9%**	**408**	**187**	**45.8%**

1.3 Radovi na deonici Naumovićevo (ulaz) - Subotica

1.3.1 Radovi u infrastrukturnim objektima u službenim mestima

- Radovi na izgradnji pothodnika u Numovićevu - stacionaža: km 166+446.80:
  - Konstruktivno objekat čini 5 kampada. Betoniranje osnovnih elemanata konstrukcije je završeno, radi se završna hidroizolacija i zaštita hidroizolacije.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su radovi na izgradnji dela peronskih zidova i TK okana u stanici Naumovićevo.
  - Radovi na konstrukciji perona II su, u najvećoj meri, završeni. Potrebno je izvršiti potrebne korekcije izvedenih kruna zidova. Na peronu I nije izveden deo peronskih zidova u zoni pothodnika koji je u izgradnji. Preostali radovi će biti izvedeni tek nakon završetka radova na konstrukciji pothodnika.
- U izveštajnom periodu na staničnoj zgradi u stanici Naumovićevo:
  - Izvode se arhitektonski radovi i ostali zanatski radovi.
  - Radovi na konstrukcijama su završeni.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade za SS i TK u železničkoj stanici Naumovićevo.
  - Radovi na konstrukciji objekta su u završnoj fazi, izvode se završni arhitektonski i instalaterski radovi.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su radovi na izgradnji pothodnika u stanici Subotica – putnička, stacionaža: km 176+610.91.
  - Konstruktivno objekat čini 8 kampada sa 5 stepeništa i 4 lifta. Izbetonirana je konstrukcija četiri kampade sa dva stepeništa i lifta.
  - U toku je priprema armature za donje ploče preostalih stepeništa, lifta i kampade.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su radovi na izgradnji peronskih zidova i TK okana u stanici Subotica.
  - Peron I: od km 176+606.613 do km 176+850.613, peron II: od km 176+449.950 do km 176+850.613, peron III: od km 176+547.428 do km 176+817.428, peron IV: od km 176+607.309 do km 176+827.119:
  - U toku nedelje izbetonirani su delovi završnih kapa peronskih zidova perona I i II u stanici Subotica. Na peronu I je izvršeno zasipanje materijala unutar perona. Na peronu IV i III su u toku završni radovi, montirana je konstrukcija nadstrešnica. Završetak perona i i II će biti moguć tek nakon završetka radova na konstrukciji pothodnika. Nedostajući delovi perosnkih zidova perona III su spremni za betoniranje. Na peronu br. II se montira čelična konstrukcija nadsteršnice.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su radovi na izgradnji zgrade ETP – deonica kontaktne mreže Subotica, stacionaža: od km 176+421.26 do 176+483.10
  - U toku je malterisanje u objektu.
- Na staničnoj zgradi u stanici Subotica u toku je izvođenje građevinskih i arhitektonskih radova unutar objekta
  - Zidanje zidova, malterisanje i betoniranje podova, kao i malterisanje fasade. Izvode se i inatalacije u objektu. Izbetonirani su temelji za stubove nadstrešnice peronskog trema i u toku je nasipanje materijala podloge ploče trema. Izvedena je čelična konstrukcija nadstrešnice ispred objekta, ka staničnom trgu. Ovi radovi su izvedeni bez ikakve tehničke dokumentacije koju treba da dostavi izvođač i bez obaveštavanja nadzora.
- U izveštajnom periodu su nastavljeni radovi na izgradnji pothodnika u stanici Subotica – teretna, stacionaža: km 175+819.48.

  - Konstruktivno objekat čini 12 kampada sa 3 stepeništa. Izbetonirana je konstrukcija sedam kampada. Izbetonirana je donja ploča i zidovi za preostale kampade, priprema se armatura gornje ploče.
- U izveštajnom periodu nisu izvođeni radovi na izgradnji službene zgrade za Srbija Kargo, IŽS, Carinu, Mup i inspekcije u železničkoj stanici Subotica teretna, stacionaža: km 175+778.78.
  - Izvršena je priprema za uklanjanje opasnog i neopasnog otpada sa lokacije, što je preduslov za otpočinjanje radova.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su radovi na dogradnji zgrade za SS i TK u železničkoj stanici Subotica teretna, stacionaža: km 176+200.16
  - U toku su završni zanatski radovi u objektu, kao i radovi na spoljnom uređenju.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su radovi na izgradnji tri zgrade za TK opremu: Na objektima Subotica (stacionaža: km 179+373.25), Novi grad (stacionaža: km 171+694.01) i Kelebija (stacionaža: km 184+378.53)u toku su završni zanatski radovi u objektu, i radovi na spoljnom uređenju.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su zemljani radovi na izgradnji zgrade PS Subotica, stacionaža: km 177+300.
  - Veći deo konstrukcije objekta je izveden.
  - Duži vremenski period nema radova na objektu.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su radovi na izgradnji zgrade i rekonstrukciji spoljnog postrojenja elektrovučne podstanice - EVP Subotica, stacionaža: km 167+928.50
  - Većina radova na konstrukciji zgrade je završena, postavljeni su elementi krovne konstrukcije.
  - U toku su radovi na konstrukcijama spoljnog postrojenja.
- U toku nedelje nastavljeni su radovi na izgradnji zgrade PSN Kelebija, stacionaža: km 184+380.60.
  - Veći deo konstrukcije objekta je izveden. Kao i kod objekta PS Subotica nema informacija kada će biti nastavljeni radovi na objektu.
- Radovi na izgradnji TKK okana duž trase se izvode, veći broj šahtova je u različitoj fazi izvođenja.
- U toku nedelje nije bilo novih radova na izgradnji rampe za utovar automobila u stanici Subotica.
  - Armatura zidova je pripremljena, kao i veći deo oplate, ali se radovi betoniranja ne izvode. Dostavljen je izmenjeni projekat po primedbi DeBo, nema prepreka da izvođač nastavi radove. Rok završetka zavisi od daljih koraka izvođača, s obzirom da su izmenjenim projektom promenjene karakteristike betona stope peronskog zida koja je već izbetonirana.

Arhitektonski radovi

SUBOTICA

<u>Radovi na staničnoj zgradi</u>

PODOVI:
- Izrada armirane cementne košuljice preko podnih betonskih ploče u zonama: K-1, K-2, K-3 između osa 5 i 6 i komletnoj zoni K-4
- Završeno betoniranje ploče na prizemlju sa hidroizolacijama u zonama: K-, K-2, K-4, K-5 između osa 8 i 9
- Polaganje teraco ploča u zoni K-3 između osa 5 i 6
- Postavljanje zidne kerakike u zoni K-1

ZIDANJE I MALTERISANJE:
- Zidanje na prizemlju u centralnom delu iznad podruma
- Malterisanje prostorija na prizemlju unutar zone K-1, K-2, K-3, K-4
- Montaža suštenih plafona u zoni K-1 u sanitarnim prostorijama i kuhinji
- Zidanje unutrašnjih zidova u delu zone K-2 i centralnom delu

FASADA:

- Malterisanje završnog sloja fasade sa obradom špaletni između osa 5 i 7 sa ulične strane –Obrada ukrasa oko prozora u zoni K-3

NADSTREŠNICA na ulazu u zgradu:
- Montaža čelične konstrukcije

PROTIVPOŽ. PREMAZI:
- Završeni na drvenim tavanicama na spratu i krovnoj konstrukcije u zoni K-3
- Premazivanje PP zaštitom drvenih elemenata u zoni K-6

ETP u Subotici
- Završena izrada cementnih košuljica na spratu
- Završeno malterisanja unutar objekta
- Posrtavljnje termoizolacije na zidu unutar objekta ka negrejanom prostor

SS i TK u Subotici
- Polaganje homogenih vinil podova u prostorijama na spratu
  Montaža al I čeličnih žaluzina na fasadnim otvorima na spratu
- Nastavak postavljanja panelne čelične ograde oko objekta

1.3.2 Radovi na donjem stroju

Stanica Naumovićevo (km 165+943.07 - km 167+585,96)
- Nije bilo radova na donjem stroju

Otvorena pruga Naumovićevo - Subotica (km 167+585,96 - km 174+174,98)
- Nije bilo radova na donjem stroju

Stanica Subotica (km 174+174,98 - km 177+300,00)
- Radovi na izradi iskopa od km 174+525 do km 174+550
- Radovi na izradi sloja ojačanja od km 174+525 do km 174+550
- Radovi na izradi prelaznog sloja od km 175+275 do km 175+425
- Radovi na izradi zaštitnog sloja od km 175+275 do km 175+425
- Radovi na izradi zaštitnog sloja od km 175+425 do km 175+800
- Radovi na izradi prelaznog sloja od km 176+400 do km 176+420 i od 176+482 do km 176+550 (kod zgrade ETP-a)

Otvorena pruga Subotica – Državna granica(Kelebija) (km 177+300 - km 184+634,98)
- Radovi na izradi 4. sloja nasipa od peska od km 177+650 do km 177+850
- Radovi na izradi završnog sloja nasipa od peska od km 177+650 do km 177+850
- Radovi na izradi zaštitnog sloja od km 181+500 do km 181+900

- Radovi na izradi zaštitnog sloja od km 182+025 do km 182+400

Radovi na izradi zaštitnog sloja od km 175+425 do km 175+800

Radovi na izradi završnog sloja nasipa od peska od km 177+650 do km 177+850

Radovi na izradi zaštitnog sloja od km 181+500 do km 184+900

Izvršena su geomehanička ispitivanja i u skladu sa rezultatima merenja izvršen je prijem podtla i izvedenih slojeva nasipana na sledećim deonicama:

Stanica Naumovićevo (km 165+943.07 - km 167+585,96)

- Podtlo:
  - Nije bilo ispitivanja
- Nasip:
  - Nije bilo ispitivanja
- Sloj ojačanja:
  - Nije bilo ispitivanja
- Prelazni sloj:
  - Nije bilo ispitivanja
- Zaštitni sloj:
  - Nije bilo ispitivanja

Otvorena pruga Naumovićevo - Subotica (km 167+585,96 - km 174+174,98)

- Podtlo:
  - Nije bilo ispitivanja
- Nasip:
  - Nije bilo ispitivanja
- Sloj ojačanja:
  - Izvršen je prijem sloja ojačanja od km 173+475 do km 173+600
- Prelazni sloj:
  - Izvršen je prijem prelaznog sloja od km 173+375 do km 173+600
  - Izvršen je prijem prelaznog sloja od km 173+700 do km 173+900
- Zaštitni sloj:
  - Nije bilo ispitivanja

Stanica Subotica (km 174+174,98 - km 177+300,00)

- Podtlo:

- Izvršen je prijem iskopa od km 174+525 do km 174+550

- Nasip:
  - Nije bilo ispitivanja
- Sloj ojačanja:
  - Izvršen je prijem sloja ojačanja od km 174+525 do km 174+550
- Prelazni sloj:
  - Izvršen je prijem prelaznog sloja od km 175+275 do km 175+425
  - Izvršen je prijem prelaznog sloja od km 176+400 do km 176+420 i od 176+482 do km 176+550 (kod zgrade ETP-a)
- Zaštitni sloj:
  - Izvršen je prijem zaštitnog sloja od km 175+275 do km 175+425
  - Izvršen je prijem zaštitnog sloja od km 175+425 do km 175+800

Otvorena pruga Subotica – Državna granica(Kelebija) (km 177+300 - km 184+634,98)

- Podtlo:
  - Nije bilo ispitivanja
- Nasip:
  - Izvršen je prijem 4. sloja nasipa od peska od km 177+650 do km 177+850
  - Izvršen je prijem završnog sloja nasipa od peska od km 177+650 do km 177+850
- Sloj ojačanja:
  - Nije bilo ispitivanja
- Prelazni sloj:
  - Nije bilo ispitivanja
- Zaštitni sloj:
  - Izvršen je prijem zaštitnog sloja od km 181+500 do km 181+900
  - Izvršen je prijem zaštitnog sloja od km 182+025 do km 182+400

1.3.3 Radovi na gornjem stroju

STANICA SUBOTICA

Na delu stanice Subotica izvršeni su sledeći radovi :

- PREDBALASTIRANJE :
  - Koloseka br 3 Subotica teretna od km 175+850 do km 176+050
  - Koloseka br.4 Subotica teretna od km 175+850 do km 176+050
  - Koloseka br.5 od km 175+850 do km 176+050
  - Koloseka br.6 od km 175+775 do km 176+015
  - Koloseka br.7 od km 175+775 do km 175+985
  - Koloseka br.8 od km 175+775 do km 175+985.
  - Na delu skretnica:13t,15t,23t I 29t.
- POLAGANJE I MONTAŽA:
  KOLOSEKA
  - Koloseka br.3 na teretnom delu od km 176+242 do km 176+362
  - Koloseka br.5 na teretnom delu od km 175+945 do km 176+065
  - Koloseka br.6 na teretnom delu od km 176+012 do km 176+892
  - Koloseka br.7na teretnom delu od km 175+865 do km 175+985,
  - Koloseka br.8 na na teretnom delu od km 175+865 do km 175+985

  SKRETNICA
  - 29,65,15T i 23t
- MAŠINSKO REGULISANJE :

KOLOSEKA
- Koloseka od 51t do br.54t
- Koloseka od 54t do br.58t
- Koloseka od 56t do br.61t
- Koloseka od br.8 do br.65t

SKRETNICA
- br:8,50t,55t,49t

- AT ZAVARIVANJE:

SKRETNICA
- 6 vara na skretnici br. 8
- 6 vara na skretnici br.12
- 6 vara na skretnici br.22
- 2 vara na skretnici br.26
- 4 vara na skretnici br.27
- 2 vara na skretnici.br.31
- 6 vara na skretnici br.32
- 6 vara na skretnici br.33
- 6 vara na skretnici br.34
- 2 vara na skretnici br.36
- 2 vara na skretnici br.45
- 6 vara na skretnici br.47
- 6 vara na skretnici br.59
- 6 vara na skretnici br.60
- 6 vara na akretnici br.63t
- 2 vara na skretnici br.36t
- 6 vara na skretnici br.49t
- 6 vara na skretrnicibr.50t
- 6 vara na skretnici br.65t
- 2 vara na skretnici br.33
- 2 vara na skretnici br.60

- OTPUŠTANJE NAPONA I ZAVRŠNO ZAVARIVANJE NA ŠINAMA TIPA 49E1 :
  - Od skretnice br.27 do skretnice br.32
  - Od skretnice br.32 do skretnice br.33
  - Od skretrnice br.32 do skretnice br.36
  - Od skretnice br.33 do postojećeg koloseka.
  - Od skretnice br.18 do skretnice br.26
  - Od skretnice br.18 do skretnice br.27
  - Od skretnice br36 do kraja koloseka.
  - Od skretnice br.12 do skretnice br.22

Na osnovu telegrama br.194 f od 26.03.2024 godine zbog radova na ulaznom grlu teretne stanice Subotica zatvorena je pruga Subotica-Javno skladište 02.04.2024 godine od 08-20časova(“horgoška “pruga) u neprekidnom zatvoru od 12 časova) kao i pruga Aleksandrovo-Subotica(“senćanska” i “beogradska” pruga) u neprekidno zatvoru od 15 dana do 17.04.2024 godine.

1.3.4 Radovi na kontaktnoj mreži i elektro-energetskim postrojenjima

ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE ZA OBJEKAT STANIČNE ZGRADE U ŽELEZNIČKOJ STANICI SUBOTICA PUTNIČKA

Na osnovu dostavljene Metodologije i Dinamičkog plana za izvođenje radova, a u skladu sa Projektom 4/2.3.23 urađeno je :

- polaganje kablova za rasvetu kroz hodnik na delu objekta K2;
- bušenje rupa za viseće lampe, polaganje kablova, postavljanje razvodnih kutija i povezivanje - prostorija 3, deo objekta K3;
- priprema za polaganje kablova rasvete, utičnica i prekidača u prostorijama 44 i 45;
- polaganje žile uzemljenja od PS-49 do SIP-a;
- postavljanje i povezivanie razvodnih kutija na regalima u hodniku na delu objekta K2;
- štemovanje i bušenje zidova za postavljanje dozni za prekidace i utičnice na delu objekta K2;
- postavljanje dozni u prostorijama 3, 4, 4.1, 5, 5.1, 48, 49, 51 i 53;
- kabliranje prostorije 47;
- povezivanje razvodnih kutija u prostorijama 51 i 57.1;
- polaganje napojnih kablova od RO 1 i RO-DA 1 do razvodnih kutija i direktnih linija prema potrošačima na delu objekta K1 i K2,
- povezivanje razvodnih kutija.

ELEKTROVUČNA PODSTANICA 110/25 kV U SUBOTICI

Na osnovu dostavljene Metodologije i Dinamičkog plana za izvođenje radova, a u skladu sa Projektom 4/1.2.3 u periodu od 22.03.2024. do 29.03.2024. izvršeno je :

- ožičenje i rasporedjivanje kablova opreme u kontrolnoj sobi;
- ožičenje prikljucnog ormana;
- montaža sabirnica.

1.3.5 Radovi na SS i TK sistemima

Na deonici između Novog Sada i Kelebije u izveštajnom period nastavljeni su radovi na postavljanju SS/TK prodora.

Sledeća tabela pokazuje procenat izvršenja prodora:

Section 3：NAUMOVICEVO-SUBOTICA	
Quantity	270
Quantity completed	177
Percent complete	**66%**

1.3.6 Radovi na hidrotehničkim instalacijama

U Lošinjskoj ulici na km 174+928 u toku su radovi na izgradnji kolektora DN 1500 mm i vodovoda DN 300 mm. Radovi se izvode sa dve ekipe na oba kraja ulice. Na kraju prema izlivu, završeno je polaganje cevovoda i montirana je izlivna gradjevina. U toku su radovi na formiranju zajedničkog slapišta kolektora V i kolektora VI.

Na strani kolektora u Balkanskoj ulici postavljanje kolektora je stiglo do mesta priključka na postojeći kolektor (KK-10). Betonirani su zidovi šahta, radi se kineta a gornja ploča se posebno priprema.

Naspram šahta KK-9, umesto ranijih, rade se priključci postojećih objekata na novi kolektor

Prema ranijim planovima, novi kolektor je završen u neophodnom obimu i 16.03.2023. god je stavljen u funkciju. Na ovaj način su stvoreni uslovi za rušenje starog kolektora na delu ispod podvožnjaka u Lošinjskoj ulici.

Vrše se radovi na izmeštanju postojećeg vodovoda DN 300 mm. Postavljena je zaštitna cev DN 500 mm u koju je postavljena radna cev od duktila DN 300 mm.

Na teretnoj stanici u Subotici se vrši gradnja drenaže.

Na putničkoj stanici u Subotici se gradi kanalizacija atmosferskih voda koja je postavljena kroz peronsku nastrešnicu. Prilikom iskopa se naišlo na betonski rezervoar iz ranijeg perioda.

Na stacionaži 173+629 se vrši izmeštanje postojećeg kanala. Izvodjač radova se suočava sa problemom nepredvidjenih larsen talpi i „lošeg“ tla (mulj)

Na stacionaži km 168+690 gradni se nadvožnjak. Odvodnjavanje površine nadvožnjaka je rešeno slivnicima i odvodnim cevovodima. Nije rešeno odvodnjavanje dilatacija na konstrukciji.

1.3.7 Geodetski radovi

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		**RIA-g14832** **Projekat potpornih zidova u zoni nadvožnjaka na km 177+329.42** Pregled i prijem oplate - D1-temeljna stopa K1	Radovi u toku nije spremno za prijem.
2		**RIA-g14834** **Projekat potpornih zidova u zoni nadvožnjaka na km 177+329.42** Pregled i prijem oplate - L1-zidovi K7, K9	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
3		**RIA-g14795** **Projekat konstrukcije U-RAM na km 0+137.10-0+483.21** Geodetski prijem oplate temeljne ploče U43-U44	Radovi su izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
4		RIA-g6444 Donji stroj na km 177+300.00 - 184+634.98 pruge Zaštitni sloj od 182 +025-182+400 - Geodetski prijem.	Radovi u toku nije spremno za prijem.

5		**RIA-g14854** **Putnički pothodnik Subotica - 176+610.91** Betoniranje - Izravnavajuci sloj na kampadama K6, K5A, K4A, K5, K4, K3	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
6		**RIA-g14843** **Projekat konstrukcije U-RAM na km 0+137.10-0+483.21** Geodetski prijem oplate temeljne ploče U9-U10	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
7		**RIA-g14844** **Projekat konstrukcije U-RAM na km 0+137.10-0+483.21** Geodetsko ispitivanje podtla kampada U41,U40	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
8		**RIA-g14843** **Projekat konstrukcije U-RAM na km 0+137.10-0+483.21** Geodetski prijem oplate temeljne ploče U9-U10	Radovi u toku uradjena samo desna strana,nije spremno za prijem.
9		**RIA-g14856** **Projekat podvožnjaka na km 168+690.06** Prijem i pregled oplate -Parapetnog i krilnog zida obalnog stuba S1	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
10		**RIA-g14819-R1** **Službeni pothodnik Subotica km 175+819,48** Prijem i pregled oplate - Gornja ploča k2,k3,k3A i k4	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
11		**RIA-g1293-R1** **Stanica Subotica - Km175+000 do 175+100** Geodetski prijem - Temelj kontaknte mreže; Temelj broj: 38, 130, 129	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
12		**RIA-g14899** **Stanici Subotica putnička** Pregled i prijem oplate - Donja ploča tko 9	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
13		**RIA-g14871-R1** **Projekat potpornih zidova u zoni nadvožnjaka na km 177+329.42** Pregled i prijem oplate - Zid L1 - kampada zida K7	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
14		**RIA-g14882** **Projekat konstrukcije U-RAM na km 0+137.10-0+483.21** Geodetski prijem podtla kampada U14-U16	Radovi u toku nije spremno za prijem.
15		**RIA-g14905** **Putnički pothodnik Subotica - 176+610.91** Pregled i prijem oplate - donja ploca lifta uz kampadu k1	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

16		**RIA-g1297** **Stanica Subotica - Km175+000 do 175+100** Geodetski prijem - Temelji kontaknte mreže; Temelj broj: 38, 40, 42, 44, 46, L15, 57, 57-1, 57-2, L16, 61, 65, 65-1	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
17		**RIA-g14903** **Putnički pothodnik Subotica - 176+610.91** Pregled i prijem oplate – 2 takta lifta uz kampadu k4	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
18		**RIA-g14909** **Peronski zidovi u stanici Subotica putnička** Geodetski prijem – Oplata Peronskih zidova na peronu 3	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
19		**RIA-g14878-R1** **Projekat betonske konstrukcije pothodnika u stanici Naumovićevo - 166+446.80** Pregled i prijem oplate - gornje ploče lifta i zidova K1 faza 4	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
20		**RIA-g6473** **Donji stroj na km 174+175 - km 177+300 pruge** Geodetski prijem Zaštitni sloj od 175+425 - 175+800	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
21		**RIA-g1297** **Stanica Subotica - Km175+000 do 175+100** Geodetski prijem - Temelji kontaknte mreže; Temelj broj: 38, 40, 42, 44, 46, L15, 57, 57-1, 57-2, L16, 61, 65, 65-1	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
22		**RIA-g14869-R2** **Propust na km 182+000,00** Geodetski prijem - plata cementne stabilizacije	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
23		**RIA-g14938** **Stanica Subotica putnička** Pregled i prijem oplate - Gornja ploča TKO 6	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
24		**RIA-g14925** **Projekat konstrukcije U-RAM na km 0+137.10-0+483.21** Geodetski prijem oplate temeljne ploče U11-U12	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
25		**RIA-g14932** **Projekat konstrukcije U-RAM na km 0+137.10-0+483.21** Geodetski prijem oplate levog i desnog zida kampade U43-U44	Radovi u toku nije spremno za prijem, Zavrsena samo oplata levog zida.

26		**RIA-g14893** **Podvožnjak na km 174+928,11** Geodetski prijem oplate zidova kampade U1 i U6	Radovi u toku nije spremno za prijem.
27		**RIA-g14946** **Projekat podvožnjaka na km 168+690.06** Prijem i pregled oplate -Ivični venac I reviziona staza od S4 do S6 desna strana segmenti 6 I 8 , leva strana segmenti 6 I 8	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
28		**RIA-g1306** **Stanica Subotica - 177+700 do 177+800** Geodetski prijem - Temelji kontaknte mreže; Temelj broj: 411, 412, 413, 414, L97, L98, L99, L100	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
29		**RIA-g6483** **Donji stroj na km 177+300.00 - 184+634.98 pruge** Geodetski prijem - Zaštitni sloj od 181+500-181+900 -	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

1.3.8 Radovi na termotehničkim i mašinskim instalacijama

Projekat izmeštanja i zaštite gasovoda JKP "SUBOTICAGAS"

- Od radova na km 173+246 i 173+629, ostalo je da se šahta kod ciglane visinski nadogradi i da poklopac bude u nivou terena.
- U Lošinjskoj ulici, trenutni izmešteni položaj gasovoda Ø32 ne smeta radovima na kolektoru, ali smetaće radovima na izradi U kada.
- Na uglu Kosovske i Bagremove ulice, pronađen je gasovod Ø32 mm i dogovoreno je da Izvođač u saradnji sa „Suboticagasom" izvrši spuštanje dela trase na veću dubinu. Radovi na ovom izmeštanju su pomereni za kasniju fazu i iskop je zatrpan.
- Kod Majšanskog mosta, na strani prema žel. stanici, postojeći gasovod Ø250 mm je u koliziji sa potpornim zidom D2-kampada 14. Izvršeno je geodetsko merenje tačnog položaja gasovoda i njegov uticaj na izradu potpornog zida. Rezultati merenja su dostavljeni Projektantima i čeka se njihov predlog rešenja.

Projekat termotehničkih instalacija – Stanična zgrada u železničkoj stanici Subotica

- Paralelno sa AG radovima u delu prostorija u krilima K1, K2, K3 i centralnog ulaza, u toku su mašinski radovi na termotehničkim instalacijama grejanja, klimatizacije i ventilacije.
- Radovi na rekonstrukciji objekta ambulante železničkih radnika su završeni. Prema projektu, postojeća instalacija grejanja se zadržava ali određeni delovi cevne mreže su dosta korodirali, naročito u zoni prodora cevi iz podruma do prizemlja i na tim mestima već je voda procurela. Sanirana su četiri oštećena mesta, na lokacijama prodora i zamenjena sa novim cevima, ali je pronađeno još jedno mesto curenja i isto je sanirano. Razomotriti predlog da se cela cevna mreža grejanja zameni u podrumskim prostorijama, zbog vrlog lošeg stanja.
- Ugrađeno je novih 8 klima i iste su povezane.

1.3.9 Mostovi i inženjerske konstrukcije

Nadvožnjak na km 168+690 (Karin Komerc)
- Montaža armature glavnog nosača na S8-S10
- Montaža armature pešačkih staza na delu S1-S6
- Urađen podložni beton za prelaznu ploču na S1
- Betoniranje pešačkih staza, kampade K1, K3 i K5, levo i desno
- Montaža armature prelazne ploče na S1
- Betoniranje pešačkih staza, kampade K2 i K4, levo i desno

Nadvožnjak na km 170+834 (Karin Komerc)
- Objekat je skoro u potpunosti završen.
- Nezavršen jedan deo radova vezan za odvodnjavanje mosta i kegle.

Propust kod prečistača na km 173+629 (Karin komerc)
- Betoniranje gornje ploče kampada K1, K2 i K3
- Betoniran krilni zid kod K1
- Betoniran parapetni zidić
- Betonirana zaštita hidroizolacije na gornjoj ploči na delu K6-K12

Podvožnjak Bajnatska na km 174+515 (Shandong Luqiao)
- Nije bilo novih radova vezanih za konstrukciju
- I dalje su otvoreni NCR-ovi 16 i 17, vezani za kvalitet betonskih zidova i PVC hidroizolacije. Ima novih procurivanja kroz zidove.

Podvožnjak Lošinjska na km 174+928 (Shandong Luqiao)
- Geomehanika zamene tla na ramu P2
- Podložni beton na ramu P2
- Betoniranje desnog zida na U3
- Betoniranje ploče na U2
- Izrada PVC hidroizolacije na P2
- Izrada zaštitnog betona na P2
- Montaža armature donje ploče na P2
- Betoniranje donje ploče na P2
- Zamena tla, geomehanika i mršavi beton na U1 i U6
- Urađena PVC hidroizolacije donje ploče na U1 i U6
- Izbetonirani zidovi na U4 i U5, desna strana

Podvožnjak Maksima Gorkog na km 176+274 (Karin komerc)
- I dalje su otvoreni NCR-ovi 22 (dilatacija na spoju ivičnog venca i zidova U-segmenata), 23 (pešačka ograda) i 24 (površina betona zidova)
- Rešavanje problema procurivanja vode unutar boksova u ramovima

Nadvožnjak Majšanski most na km 177+329 (Shandong Luqiao)
- Betoniranje stuba S2, sever, II faza

- Betoniranje stuba S2, jug I faza
- Betoniranje stuba S2, jug II faza
- Izbetonirana naglavna greda na S2
- Izbetoniran zid na S3, druga faza
- Montaža armature stubova na S2, I faza
- Demontaža oplate zida na S3
- Demontaža oplate naglavne grede na S2
- Nasipanje i nabijanje tla oko naglavne grede na S2
- Montaža armature stubova na S2, II faza
- Montaža oplate stubova na S2, II faza
- Betoniran severni stub na S2, I faza

Potporni zidovi na km 177+329 (Karin komerc)
- Zamena tla na delu D1, kampade K1, K2 i K3, sa geomehaničkim ispitivanjem
- Armiranje temeljnih ploča na delu L1, kampade K1, K3, K5, K7, K9
- Betoniranje podložnog betona na delu L2, kampade K1 do K5
- Iskop za potporne zidove sa desne strane (L3 i D2)
- Betoniranje temeljnih ploča na delu L1, kampade K1, K3, K5, K7, K9
- Montaža armature temeljne ploče na delu L1, kampade K2, K4, K6 i K8

Galerija na km 177+627 (Shandong Luqiao)
- Betoniranje prelazne ploče sever (cementna stabilizacija)
- Izrada MMA hidroizolacije gornje ploče

Potporna konstrukcija „U-ram“ na km 0+137,10 – 0+483,21 i na km 0+558,00 – 1+314,40 – ona se ukršta sa objektom Galerije na km 177+627
- Montaža armature ploče segmenata U45-U46
- Iskop za segmente U8, U9
- Betoniranje ploče U45-U46
- Betoniranje zidova U1-U2, levo i desno
- Geomehanika za segment U8
- Podložni beton na U8
- Montaža armature zidova na U45-U46
- Montaža armature ploče na U3-U4
- Geomehanika za segment U9
- Podložni beton na U9
- Betoniranje zidova na U45-U46, levo
- Betonirana ploča na U3-U4
- Montaža armature donje ploče segmenata U1-U2
- Montaža armature donje ploče segmenata U47-U48
- Betonirana donja ploča na U47-U48
- Betonirana donja ploča na U1-U2
- Armiranje zidova U47-U48, leva i desna strana
- Iskop za segmente U3-U4-U5 (uočeni nedostaci u projektu, problem postavljanja fugebanda zbog promene debljine zidova zbog postojanja stubova KM na zidu U3 i U4, levo)
- Priprema zidova U49-U50 za nanošenje hidroizolacije MMA
- Montiranje oplate zidova U47-U48, leva strana
- Nasipanje i nabijanje iberlaufa i drobljenog kamena na U3-U5
- Nanošenje prajmera na zidove segmenata U49-U50
- Betoniranje zidova U47-U48, leva strana
- Armiranje donje ploče na U45-U46

- Betoniranje podložnog betona na U3-U5
- Iskop za kampade U6-U8
- Betoniranje zidova U47-U48, desna strana

Podvožnjak Kosovska na km 177+857
- Otvoren za drumski saobraćaj 11.02.2024.
- Radi se nasip na prelaznim zonama
- Betoniranje prelaznih ploča, 1. sloj, sever i jug

178+780
- Kompletno završen

179+340 (Karin komerc)
- Kompletno završen

Nadvožnjak na km 179+395 (Karin komerc)
- Pušten u drumski saobraćaj 02.09.2023

182+400
- Završena konstrukcija.

182+600
- Završena konstrukcija.

182+800
- Završena konstrukcija.

183+000
- Završena konstrukcija.

Propust na km 183+600 (Karin komerc)
- Završena konstrukcija.

Propust na km 183+800 (Karin komerc)
- Završena konstrukcija.

Propust na km 184+400 (Karin komerc)
- Završena konstrukcija.

Propust na km 184+600 (Karin komerc)
- Završena konstrukcija.

2. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Deonica Novi Sad - Vrbas

Glavni izvođač radova i njegovi podizvođači izvode radove prema nedeljnom planu koji je dostavljen Nadzoru u dogovorenom terminu.

Po nalogu Finasijera Projekta uvedeno je produženo radno vreme na Projektu, u dve smene. Za sada se radovi odvijaju samo u vidnom delu dana.

Mere Bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištu su uglavnom skladu sa Planom preventivnih mera. U toku obilazaka su uočene manje nepravilnosti u vidu rada bez korišćenja zaštitnih šlemova. Izvođači radova su postupili po nalogu Koordinatora za BZR ispred tima Nadzora i otklonili nedostatke u zadatom roku.

Glavni izvođač radova i svi podizvođači koji su trenutno na gradilištu deonice 1 poseduju kompletnu i ažurnu dokumentaciju Bezbednosti i zdravlja na radu.

 Stanica Novi Sad	 **Radovi unutar stanice Novi Sad**
 Podvožnjak u Partizanskoj ulici u Novom Sadu	 **Novi Sad – okolina Ranžirne stanice km 78+377**
 TPS Novi Sad	 **Rasputnica Sajlovo**
 Stepanovićevo- Železnička stanica	 **Kisač-Železnička stanica**
 Rumenka, Železnička stanica	 **Zmajevo-Železnička stanica**
 Gornje Sajlovo-pruga	 **Kisač-Stepanovićevo km 95+825**
 Zmajevo, km 98+110	 **Rumenka km 82+159**

Zmajevo, km 98+149	**Rumenka, km 82+300**
Stepanovićevo, km 97+027	**Zmajevo, km 101+132**
EVP Novi Sad, km 79+998	**Kisač, km 89+984**

Deonica Vrbas - Naumovićevo

U protekloj sedmici na deonici nije bilo prijavljenih povreda na radu, a desio se vanrednih događaj – manje oštećenje 1 podzemnog kabla na podvožnjaku u Novom Žedniku na 157+ 443 km

Izvođači radova izvode radove prema nedeljnom planu rada koji je delimično ažuriran.

Plan rada je dostavljen Nadzoru u dogovorenom terminu.

Na gradilištu se primenjuju lične i kolektivne mere Bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa Planom preventivnih mera uz neke manje nepravilnosti.

Prilikom redovnih obilazaka gradilišta uočene su nepravilnosti u primeni neophodnih mera BZR od strane izvođača radova opisane u Prilogu br 6.

Manje nepravilnosti se otklanjaju odmah po ukazivanju na njih.

Izvođačima radova je skrenuta pažnja na rad noću i prekovremeni rad i obaveza primene svih zakonskih obaveza u tom slučaju.

Problemi su i dalje kod: privremene el. Instalacije (el.ormari, produžni kablovi, ispitivanja iste), nepravilnog montiranja skela (radnih podova), radnih platformi, rad na visini ograđivanja i uređenosti gradilišta, obezbeđenje iskopa.

Poseban problem prestavljaju privremene električne instalacije koje se ne održavaju, ispitiju, uočeni nedostaci se redovno dostavljaju izvođačima radova ali se i dalje ne otklanjaju.

Vrši se ispitivanje el.razvodnih ormara sa sporom dinamikom.

Na gradilištu se i dalje pojavljuju novi podizvođači radova, koje postojeći izvođači/podizvođači angažuju za rad na gradilištu, ne najavljuju/prijavljuju i nemaju kompletnu BZR dokumentaciju.

To se posebno odnosi na izvođače radova u završnim građevinskim radovima koji se pojavljuju na gradilištu kratko svega nekoliko dana.

 Vrbas Podvožnjak 113+327,64	 Vrbas Pothodnik – Stanica 113+610
 Vrbas Vijadukt 117+155,43	 Vrbas Vijadukt 117+633,62
 Vrbas Nadvožnjak 120+571,30	 Lovćenac Nadvožnjak 125+191,62
 Lovćenac Nadvožnjak 126+976	 Lovćenac Stanica 129+485
 Mali Iđoš Nadvožnjak 131+245,45	 Mali Iđoš Vijadukt 131+830,64

Bačka Topola ECODUKT 137+300	Mali Iđoš Nadvožnjak 139+003,02
 Bačka Topola Pothodnik 142+055	Bačka Topola Pothodnik 142+712
Bačka Topola Stanica 143+536	Verušić Nadvožnjak 160+094,84
Novi Žednik Podvožnjak 157+443,73	Bačka Topola Podvožnjak 142+055

Deonica Naumovićevo - Subotica

Na deonici br. 3 gde radove izvodi SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD, CHINA CIVIL ENGINEERIG CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD, *CHINA RAILWAY CONSTRUCTION ELECTRIFICATION BUREAU GROUP CO. LTD SERBIA* OGRANAK BEOGRAD i CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION sa podizvođačima i dalje se ne primenjuju u potpunosti mere kojima se osigurava bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/23) i važećim pravilnicima.

Kada dva ili više poslodavaca u obavljanju poslova dele radni prostor, odnosno kada zaposleni više poslodavaca istovremeno obavljaju poslove u istom radnom prostoru, poslodavci su dužni da sarađuju u primeni propisanih mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih. Ova saradnja se ostvaruje na osnovu pisanog sporazuma koji se zaključuje pre početaka radova. Sporazumom određuje se lice za koordinaciju sprovođenja zajedničkih mera kojima se obezbeđuje bezbednost i zdravlje svih zaposlenih. Ovo je obaveza po članu 24 Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/23) koja na deonici 3 nije sprovedena.

Naumovićevo

Železnička stanica Subotica Km 177+020

Železnička stanica Subotica Km 176+456

Galerija Kosovska ulica Km 177+857

Rekonstrucija zgrade SS i TK u Subotici Km 176+214

Subotica Km168+690

Rekonstrucija stanične zgrade u Subotici Km 176+533

Subotica Km 172+ 193

EVP Subotica Km 167+900

Subotica Km171+230

Subotica Km184+258

Subotica Km177+300

Subotica, KM179+395

Subotica Km181+950

Subotica Km 177+857 Kosovska ulica

Subotica Km 173+625

Subotica Km 174+925

Subotica Km 177+325

Subotica Km 175+825

3. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

U izveštajnom periodu vršeno je redovno praćenje radova duž čitave trase. Radovi se vrše punim intenzitetom. Primećene su nepravilnosti vezane za parametre životne sredine. Viškovi betona se i dalje deponuju na nedozvoljen način. Stanje opšte higijene na gradilištima nije na zadovoljavajućem nivou. I dalje su primetne velike količine otpada rasutog oko kampova duž trase. U Vrbasu, na lokaciji izgradnje vijadukta Izvođač je izvršio sanaciju kontaminiranog tla, iskpao jamu za prikupljanje viškova betona i pranje miksera i o svemo tome pismom izvestio Inženjera.

STANJE ŽIVOTNE SREDINE NA GRADILIŠTU		
FOTOGRAFIJA	**LOKACIJA**	**OPIS**
	Subotica, Maksima Gorkog	**Neucrtani energetski kablovi**
	Zmajevo	**Nepropisno deponovan otpad na gradilištu**
	Novi Sad	**Nepropisno deponovani viškovi betona na gradilištu**
	Stanica Novi Sad	**Rasut otpad različitog porekla**
	Stepanovićevo	**Rasut otpad različitog porekla kao i viškovi betona**

4. FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Finansijski izveštaj zaključno sa 14.04.2024.godine

U okviru Nedeljnog izveštaja za period 08.04.2024. – 14.04.2024. godine

Pregled ugovorne dokumentacije:

Ugovor:	Komercijalni ugovor o modernizaciji I rekonstrukciji mađersko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)
Ugovor br:	340-5583/2018-3 od 07.07.2018. 1/2018-1950 od 07.07.2018. (zaveden kod Investitora) CRIC/2018/001 od 07.07.2018. (zaveden kod Izvođača)
Aneks ugovora br.1	340-05-5892/2021-1 od 25.06.2021. 1/2021-1550/385 od 25.06.2021.(zaveden kod Investitora) CRIC(S)/2021/003-112 od 25.06.2021. (zaveden kod Izvođača)
Aneks ugovora br.2	340-9986/2022 od 09.12.2022. 1/2022-1/1204 od 09.12.2022.(zaveden kod Investitora) JV-NSSB-2022-02 od 09.12.2022. (zaveden kod Izvođača)
Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima	401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine 1/2022 – 1/1090 od 25.10.2022. godine (zaveden kod Investitora) JV-NSSB-2022-01 od 05.10.2022. (zaveden kod Izvođača)
Aneks ugovora br.3	340-9166/2023 od 06.10.2023. 1/2023-1/800 od 06.10.2023.(zaveden kod Investitora) JV-NSSB-2023-01 od 06.10.2023. (zaveden kod Izvođača)
Aneks ugovora br.4	340-2110/2024-1 od 15.03.2024. 1/2024-1/201 od 15.03.2024.(zaveden kod Investitora) JV-NSSB-2024-01 od 15.03.2024. (zaveden kod Izvođača)
Ugovorna suma:	USD 1.162.810.000 (bez PDV-a) – Osnovni ugovor/Aneks br.1 USD 6.512.453,59 (bez PDV-a) – Aneks br.2 USD 111.999.042,00 (bez PDV-a) – Sporazum broj 1 *Napomena:* deo radova definisanih Sporazumom 1 u iznosu od USD 18.842.062,00, su ugovoreni kroz Aneks 3 Ugovora USD 28.137.000,91 (bez PDV-a) – Aneks br.3 USD 52.301.209,67 (bez PDV-a) – Aneks br.4 *Napomena:* deo radova definisanih Sporazumom 1 u iznosu od USD 28.787.787,00, su ugovoreni kroz Aneks 4 Ugovora

Pregled privremenih situacija Izvođača:

1.Privremena situacija za isporuku tehničke dokumentacije (br.003)
Nadzor je pregledao i overio 1 privremenu situaciju br. 003 za isporuku tehničke dokumentacije (izrada PGDa), overena 05.06.2022.godine
Realizacija: 17.442.150 USD (1,50%)

1.Privremena situacija za izvođenje radova (br.004)
Nadzor je pregledao i overio listove GK za izvedene radove zaključno sa 30.04.2022.godine.
Nadzor je pregledao i overio 1 privremenu situaciju za radove br.004 (overena 13.06.2022.godine).
Realizacija: 9.614.914,68 USD
Kumulativno: 27.057.064,68 USD (2,33%)

2.Privremena situacija za izvođenje radova (br.005)
Nadzor je pregledao i overio listove GK za izvedene radove zaključno sa 31.05.2022.godine.
Nadzor je pregledao i overio 2 privremenu situaciju za radove br.005 (overena 15.08.2022.godine).
Realizacija: 13.903.894,87 USD
Kumulativno: 40.960.959,55 USD (3,52%)

3.Privremena situacija za izvođenje radova (br.006)
Nadzor je pregledao i overio listove GK za izvedene radove zaključno sa 31.08.2022.godine.
Nadzor je pregledao i overio 3 privremenu situaciju za radove br.006 (overena 13.10.2022.godine).
Realizacija: 18.731.500,62 USD
Kumulativno: 59.692.460,17 USD (5,13%)

4.Privremena situacija za izvođenje radova (br.007)
Nadzor je pregledao i overio obračunske listove za izvedene radove zaključno sa 30.09.2022.godine
Nadzor je pregledao i overio 4 privremenu situaciju za radove br.007 (overena 09.11.2022.godine).
Realizacija: 19.477.681,74 USD
Kumulativno: 79.170.141,91 USD (6,81%)

5.Privremena situacija za izvođenje radova (br.008)
Nadzor je pregledao i overio obračunske listove za izvedene radove zaključno sa 31.10.2022.godine
Nadzor je pregledao i overio 5 privremenu situaciju za radove br.008 (overena 24.11.2022.godine).
Realizacija: 27.708.577,62 USD
Kumulativno: 106.878.719,53 USD (9,19%)

2. Privremena situacija za isporuku tehničke dokumentacije PZI (br.009)
Nadzor je pregledao i overio 2 privremenu situaciju br. 009 za isporuku tehničke dokumentacije, overena 30.11.2022.godine
Realizacija: 11.686.240,00 USD
Kumulativno: 118.564.959,53 USD (10,20%)

1.Privremena situacija za izvođenje radova – Aneks br.2 (br.011)
Nadzor je pregledao i overio obračunske listove za izvedene radove po Aneksu br.2 (period 01.01-18.03.2022.godine)
Nadzor je pregledao i overio 1 privremenu situaciju za radove br.011 (overena 12.12.2022.godine).
Realizacija: 2.945.453,58 USD
Kumulativno: 121.510.413,11 USD (10,39%)

6. Privremena situacija za izvođenje radova (br.012)

Nadzor je pregledao i overio obračunske listove za izvedene radove zaključno sa 09.12.2022.godine (period 01.11 – 09.12.2022.godine).
Nadzor je pregledao i overio 6 privremenu situaciju za radove br.012 (overena 19.01.2023.godine).
Realizacija: 67.934.326,27 USD
Kumulativno: 189.444.739,38 USD (16,20%)

7. Privremena situacija za izvođenje radova (br.013)

Nadzor je pregledao i overio obračunske listove za izvedene radove zaključno sa 27.01.2023.godine (period 10.12.2022. -27.01.2023.godine).
Nadzor je pregledao i overio 7 privremenu situaciju za radove br.013 (overena 27.02.2023.godine).
Realizacija: 34.930.990,57 USD
Kumulativno: 224.375.729,95 USD (19,19%)

8. Privremena situacija za izvođenje radova (br.014)

Nadzor je pregledao i overio obračunske listove za izvedene radove zaključno sa 24.02.2023. godine (period 28.01.2023. – 24.02.2023.godine) i dostavio ih Izvođaču radova dopisom NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-0866.
Nadzor je pregledao i overio 8 privremenu situaciju za radove br.014 (overena 05.04.2023.godine)
Realizacija: 30.819.701,52 USD
Kumulativno: 255.195.431,47 USD (21,82 %)

Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine
Nadzor je pregledao i overio obračunske listove za izvedene naknadne radove i dostavio ih Izvođaču radova dopisom NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-0867. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 5.373.129,47 USD.

9. Privremena situacija za izvođenje radova (br.015)

Nadzor je pregledao i overio obračunske listove za izvedene radove zaključno sa 03.04.2023. godine (period 25.02.2023. – 03.04.2023.godine) i dostavio ih Izvođaču radova dopisom NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-1029.
Nadzor je pregledao i overio 9 privremenu situaciju za radove br.015 (overena 03.05.2023.godine).
Realizacija: 53.519.981,39 USD
Kumulativno: 308.715.412,86 USD (26,40 %)

Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine
Nadzor je pregledao i overio obračunske listove za izvedene naknadne i dostavio ih Izvođaču radova dopisom NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-1030 od 20.04.2023. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 12.132.007,46 USD, što u kumulativu iznosi 17.505.136,93 USD.

10. Privremena situacija za izvođenje radova (br.016)

Nadzor je pregledao i overio obračunske listove za izvedene radove zaključno sa 03.05.2023. godine (period od 04.04.2023. – 03.05.2023.godine) i dostavio ih Izvođaču radova dopisom NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-1137.
Nadzor je pregledao i overio 10 privremenu situaciju za radove br.016 (overena 31.05.2023.godine).
Realizacija: 49.478.209,26 USD
Kumulativno: 358.193.622,12 USD (30,63 %)

Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine

Nadzor je pregledao i overio obračunske listove za izvedene naknadne radove i dostavio ih Izvođaču radova dopisom NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-1138. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 1.572.536,07 USD, što u kumulativu iznosi 19.077.673,00 USD.

11. Privremena situacija za izvođenje radova (br.017)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0095 od 05.06.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 04.05.2023. – 01.06.2023.godine.
Nadzor je pregledao i overio 11 privremenu situaciju za radove br.017 (overena 12.07.2023. godine).
Realizacija: 55.525.548,29 USD
Kumulativno: 410.773.716,85 USD (35,33 %)

Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0096 od 05.06.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove (u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima i tabelom cena koja je sastavni deo Sporazuma broj 1) na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 1.290.375,85 USD, što u kumulativu iznosi 20.368.0048,85 USD.

12. Privremena situacija za izvođenje radova (br.018)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0112 od 07.07.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 02.06.2023. – 03.07.2023.godine.
Nadzor je pregledao i overio 12 privremenu situaciju za radove br.018 (overena 07.08.2023. godine).
Realizacija: 69.384.240,90 USD
Kumulativno: 483.103.411,31 USD (41,31 %)

Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0113 od 07.07.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove (u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadanim radovima i tabelom cena koja je sastavni deo Sporazuma broj 1) na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 3.137.649,58 USD, što u kumulativu iznosi 23.505.698,43 USD.

13. Privremena situacija za izvođenje radova (br.019)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0134 od 08.08.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 04.07.2023. – 03.08.2023.godine.
Nadzor je pregledao i overio 13 privremenu situaciju za radove br.019 (overena 19.09.2023. godine).
Realizacija: 77.079.449,40 USD
Kumulativno: 560.182.860,71 USD (47,91 %)

Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0135 od 08.08.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove (u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o nakndanim radovima i tabelom cena koja je sastavni deo Sporazuma broj 1) na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 7.639.115,88 USD, što u kumulativu iznosi 31.144.814,31 USD.

14. Privremena situacija za izvođenje radova (br.020)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0147 od 05.09.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 04.08.2023. – 01.09.2023.godine.

Nadzor je pregledao i overio 14 privremenu situaciju za radove br.020 (overena 12.10.2023. godine).
Realizacija: 43.830.370,77 USD
Kumulativno: 604.013.231,50 USD (51,65 %)

Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine
Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0148 od 05.09.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove (u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o nakndanim radovima i tabelom cena koja je sastavni deo Sporazuma broj 1) na kontrolu i overu. . Vrednost radova overenih obračunskih listova je 6.286.270,04 USD, što u kumulativu iznosi 37.431.084,35 USD.

15. Privremena situacija za izvođenje radova (br.021)
Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0165 od 12.10.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 02.09.2023. – 02.10.2023.godine.
Nadzor je pregledao i overio 15 privremenu situaciju za radove br.021 (overena 09.11.2023. godine).
Realizacija: 78.508.780,88 USD
Kumulativno: 682.522.012,36 USD (57,00 %)
Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2 i Aneks 3)

Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine
Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0166 od 12.10.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove (u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o nakndanim radovima i tabelom cena koja je sastavni deo Sporazuma broj 1) na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 2.461.275,03 USD, što u kumulativu iznosi 39.892.359,38 USD.

1.Privremena situacija za izvođenje radova i usluge – Aneks br.3 (br.022)
Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0170 od 19.10.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za radove po Aneksu broj 3 ugovora.
Nadzor je pregledao i overio 1 privremenu situaciju za Aneks 3 br.022 (overena 14.11.2023. godine).
Realizacija: 24.993.158,74 USD
Kumulativno: 707.515.171,10 USD (59,08 %)
Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2 i Aneks 3)

16. Privremena situacija za izvođenje radova (br.023)
Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0183 od 03.11.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 03.10.2023. – 01.11.2023.godine.
Nadzor je pregledao i overio 16 privremenu situaciju za radove br.023 (overena 01.12.2023. godine).
Realizacija: 73.958.922,62 USD
Kumulativno: 781.474.093,72 USD (65,26 %)
Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2 i Aneks 3)

Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine
Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0184 od 03.11.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove (u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o nakndanim radovima i tabelom cena koja je sastavni deo Sporazuma broj 1) na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 1.945.567,45 USD, što u kumulativu iznosi 23.350.324,00 USD.

Napomena: Radovi na rekonsrtukciji podvožnjaka u Partizanskoj i Kisačkoj ulici u Novom Sadu i izradi donjeg stroja vijadukta na km 131+830,64 definisani Sporazumom 1, u ukupnoj vrednosti od 18.842.062,00 USD, su Ugovoreni u okviru Aneksa 3 Komercijalnog Ugovora. Ranije overeni obračuski listovi za predmetne radove neće se prikazivati u kumulativu odobrenih radova za Sporazum 1 (ukupna vrednost do sada odobrenih pozicija radova je 18.487.602,83 USD), već će se prikazivati u okviru situacija vezanih za Aneks 3 Komercijalnog Ugovora.

17. Privremena situacija za izvođenje radova (br.024)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0220 od 05.12.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 02.11.2023. – 30.11.2023.godine.
Nadzor je pregledao i overio 17 privremenu situaciju za radove br.024 (overena 10.01.2024. godine).

Realizacija: 46.784.514,89 USD
Kumulativno: 828.258.608,61 USD (69,17 %)
Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2 i Aneks 3)

Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0221 od 05.12.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove (u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o nakndanim radovima i tabelom cena koja je sastavni deo Sporazuma broj 1) na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 2.306.229,34 USD, što u kumulativu iznosi 25.656.553,34 USD.

18. Privremena situacija za izvođenje radova (br.025)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0239 od 31.12.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.12.2023. – 31.12.2023.godine. Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga (obrazloženje Izvođača, veza mail od 22.01.2024. godine, Subject: XVIII privremena situacija broj 025)
Nadzor je pregledao i overio 18 privremenu situaciju za radove br.025 (overena 01.02.2024. godine).

Realizacija: 2.018.525,20 USD
Kumulativno: 830.277.133,81 USD (69,34 %)
Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2 i Aneks 3)

Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0240 od 31.12.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove (u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o nakndanim radovima i tabelom cena koja je sastavni deo Sporazuma broj 1) na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 1.248.775,69 USD, što u kumulativu iznosi 26.905.329,03 USD.

19. Privremena situacija za izvođenje radova (br.026)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0021 od 05.02.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.01.2024. – 31.01.2024.godine. Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.
Nadzor je pregledao i overio privremenu situaciju za radove (broj 026-A i 026-C overena 22.03.2024. godine i broj 026-B i 026-D overena 05.04.2024. godine).

Realizacija: 92.597.258,67 USD
Kumulativno: 922.874.392,48 USD (77,07%)
Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2 i Aneks 3)

Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0022 od 05.02.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove (u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o nakndanim radovima i tabelom cena koja je sastavni deo Sporazuma broj 1) na kontrolu i overu. . Vrednost radova overenih obračunskih listova je 1.444.376,56 USD, što u kumulativu iznosi 28.349.705,59 USD.

20. Privremena situacija za izvođenje radova (br.027)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0026 od 05.03.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.02.2024. – 29.02.2024.godine. Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio privremenu situaciju za radove (broj 027-A i 027-C overena 02.04.2024. godine i broj 027-B i 027-D overena 05.04.2024. godine).

Realizacija: 27.398.560,33 USD

Kumulativno: 950.272.952,82 USD (76,04%)

Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2, Aneks 3 i Aneks 4)

Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0027 od 05.03.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove (u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o nakndanim radovima i tabelom cena koja je sastavni deo Sporazuma broj 1) na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 614.896,00 USD, što u kumulativu iznosi 6.854.038,44 USD.

Napomena: Radovi na demontaži postojećeg donjeg stroja od km. 131+584 do km. 132+077, izgradnji pešačko-biciklističkog podvožnjaka u km. 89+984,34, izgradnji nadvožnjaka u km. 95+739,56, rekonstrukcija podvožnjaka u km. 176+274,62, povećanju površine nadvožnjaka usled povećanja širine, izgradnja vijadukta u km. 131+830,64 (preostali radovi koji nisu bili uključeni u Aneks 3) definisani Sporazumom 1, u ukupnoj vrednosti od 28.787.787,00 USD, su Ugovoreni u okviru Aneksa 4 Komercijalnog Ugovora. Ranije overeni obračuski listovi za predmetne radove neće se prikazivati u kumulativu odobrenih radova za Sporazum 1 (ukupna vrednost do sada odobrenih pozicija radova je 22.110.563,06 USD), već će se prikazivati u okviru situacija vezanih za Aneks 4 Komercijalnog Ugovora.

2. Privremena situacija za izvođenje radova i usluge – Aneks br.3 (br.028)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0044 od 29.03.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove za radove po Aneksu broj 3 ugovora na kontrolu i overu. U toku je pregled i overavanje obračunskih listova.

1. Privremena situacija za izvođenje radova i usluge – Aneks br.4 (br.029)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0045 od 29.03.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove za radove po Aneksu broj 4 ugovora na kontrolu i overu. U toku je pregled i overavanje obračunskih listova.

21. Privremena situacija za izvođenje radova i usluge (br.028)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0058 od 05.04.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.03.2024. – 31.03.2024.godine. U toku je pregled i overavanje obračunskih listova.

Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0059 od 05.04.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove (u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o nakndanim radovima i tabelom cena koja je sastavni deo Sporazuma broj 1) na kontrolu i overu. U toku je pregled i overavanje obračunskih listova.

Pregled realizovanih radova/usluga Izvođača prema overenim privremenim situacijama (u izveštajnom periodu 08.04. – 14.04.2024.godine):

Opis	*Ugovorena vrednost*	*Prethodni period*	*Iznos po tekućoj situaciji*	*Kumulativni iznos*	*% kumulativnih izvedenih Radova*
Izvođač - JV CRIC-CCCC - radovi i usluge overeni u privremenim situacijama					
Privremene situacije Izvođača (za radove i usluge zaključno sa 29.02.2024.godine)					
Osnovni ugovor					
1. Izvedeni radovi	**1.127.925.700**	**893.205.950**	**0**	**893.205.950**	**79,19%**
1. Arhitektonski radovi	16.600.314	9.074.845	0	9.074.845	54,67%
2. Radovi na donjem stroju	209.735.688	200.208.398	0	200.208.398	95,46%
3. Radovi na gornjem stroju	249.437.955	187.048.745	0	187.048.745	74,99%
4. Mostovi, propusti i podvožnjaci	253.938.256	231.387.598	0	231.387.598	91,12%
5. Pristupni putevi i devijacije	27.374.721	16.430.894	0	16.430.894	60,02%
6. Drenažni radovi	8.971.793	3.246.559	0	3.246.559	36,19%
7. Kontaktna mreža	80.679.702	58.344.215	0	58.344.215	72,32%
8. Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS	22.273.130	14.456.275	0	14.456.275	64,90%
9. Napajanje	26.601.912	17.434.585	0	17.434.585	65,54%
10. Signalno-sigurnosni sistemi	116.510.191	83.479.352	0	83.479.352	71,65%
11. Telekomunikacioni sistemi	71.650.868	44.140.847	0	44.140.847	61,61%
12. Termotehničke i protivpožarne instalacije	5.809.444	1.532.057	0	1.532.057	26,37%
13. Mašinske instalacije i radovi	2.610.409	493.147	0	493.147	18,89%
14. Putna saobraćajna signalizacija i oprema	1.371.233	257.394	0	257.394	18,77%
15. Pejzažno uređenje, peroni i mere zaštite životne sredine	34.360.084	25.671.041	0	25.671.041	74,71%
2. Projektovanje	**34.884.300**	**29.128.390**	**0**	**29.128.390**	**83,50%**
1. Troškovi projektovanja (PGD)	17.442.150	17.442.150	0	17.442.150	100,00%
2. Troškovi projektovanja (PZI)	17.442.150	11.686.240	0	11.686.240	67,00%
Ukupno po Osnovnom ugovoru/Aneks br.1 :	**1.162.810.000**	**922.334.340**	**0**	**922.334.340**	**79,32%**
Aneks br.2					
Radovi i usluge po Aneksu br.2	6.512.454	2.945.454	0	2.945.454	45,23%
Ukupno po Aneksu br.2 :	**6.512.454**	**2.945.454**	**0**	**2.945.454**	**45,23%**
Aneks br.3					
Radovi i usluge po Aneksu br.3	28.137.001	24.993.159	0	24.993.159	88,83%
Ukupno po Aneksu br.3 :	**28.137.001**	**24.993.159**	**0**	**24.993.159**	**88,83%**

Opis	*Ugovorena vrednost*	*Prethodni period*	*Iznos po tekućoj situaciji*	*Kumulativni iznos*	*% kumulativnih izvedenih Radova*
Izvođač - JV CRIC-CCCC - radovi i usluge overeni u privremenim situacijama					
Privremene situacije Izvođača (za radove i usluge zaključno sa 29.02.2024.godine)					
Aneks br.4					
Radovi i usluge po Aneksu br.4	52.301.210	0	0	0	0,00%
Ukupno po Aneksu br.4 :	**52.301.210**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
UKUPNO:	**1.249.760.664**	**950.272.953**	**0**	**950.272.953**	**76,04%**

Poslednje overene situacije su privremene situacije za radove i usluge broj 026-B i 026-D i broj 027-B i 027-D (overene 05.04.2024. godine).

Pregled realizovanih radova/usluga Izvođača prema overenim privremenim situacijama (u izveštajnom periodu zaključno sa 07.04.2024.godine):

Komercijalni ugovor, broj 340-5583/2018-3 od 07.07.2018.,prihvaćeni ugovorni iznos : 1.162.810.000,00 USD

Avansne situacije

Redni Br.	Opis	Datum potpisivanja od strane stručnog Nadzora	Iznos plaćanja za izvršene radove USD (a)	Odbitak za povraćaj avansa (30% iznosa za plaćanje) (b)	Odbitak za zadržane sume (5% iznosa za plaćanje) (c)	Deo za kinesku EXIM Banku (85%) USD (e=(a-b-c)×85%)	Deo za finansijera (15%) USD (f=(a-b-c)×15%)	Plaćanja za obračunski period USD (g=e+f)	Napomene
001	1 deo Avansa	12.07.2021.	232.562.000	0	0	197.677.700	34.884.300	232.562.000	20% od Prihvaćenog ugovornog iznosa. Deo za radova u iznosu od 225.585.140,00 USD i deo za projektovanje u iznosu od 6.976.860,00 USD. Situacija potpisana od strane prethodnoh stručnog Nadzora, IŽS.
002	2 deo Avansa	05.10.2021.	58.140.500	0	0	49.419.425	8.721.075	58.140.500	5% od Prihvaćenog ugovornog iznosa. Deo za radova u iznosu od 56.396.285,00 USD i deo za projektovanje u iznosu od 1.744.215,00 USD. Situacija potpisana od strane prethodnoh stručnog Nadzora, IŽS.
Total (USD)			**290.702.500**	**0**	**0**	**247.097.125**	**43.605.375**	**290.702.500**	

Privremene situacije

Redni Br.	Opis	Datum potpisivanja od strane stručnog Nadzora	Iznos plaćanja za izvršene radove, ne uključujući Avans USD (a)	Odbitak za povraćaj avansa (30% iznosa za plaćanje) (b)	Odbitak za zadržane sume (5% iznosa za plaćanje) (c)	Deo za kinesku EXIM Banku (85%) USD (e=(a-b-c)×85%)	Deo za finansijera (15%) USD (f=(a-b-c)×15%)	Plaćanja za obračunski period USD (g=e+f)	Napomene
003	1. situacija za Projektovanje	05.06.2022	17.442.150	5.232.645	872.108	9.636.788	1.700.610	11.337.398	-
004	1. situacija za Radove	13.06.2022.	9.614.915	2.884.474	480.746	5.312.240	937.454	6.249.695	period izvođenja radova 01.04.2022. - 30.04.2022.
005	2. situacija za Radove	15.08.2022.	13.903.895	4.171.168	695.195	7.681.902	1.355.630	9.037.532	period izvođenja radova 01.05.2022. - 31.05.2022.
006	3. situacija za Radove	13.10.2022.	18.731.501	5.619.450	936.575	10.349.154	1.826.321	12.175.475	period izvođenja radova 01.06.2022. - 31.08.2022.
007	4. situacija za Radove	09.11.2022.	19.477.682	5.843.305	973.884	10.761.419	1.899.074	12.660.493	period izvođenja radova 01.09.2022. - 30.09.2022.
008	5. situacija za Radove	24.11.2022.	27.708.578	8.312.573	1.385.429	15.308.989	2.701.586	18.010.575	period izvođenja radova 01.10.2022. - 31.10.2022.
009	2. situacija za Projektovanje	30.11.2022.	11.686.240	3.488.430	584.312	6.471.473	1.142.025	7.613.498	-
012	6. situacija za Radove	19.01.2023.	67.934.326	20.380.298	3.396.716	37.533.715	6.623.597	44.157.312	period izvođenja radova 01.11.2022. - 09.12.2022.
013	7. situacija za Radove	27.02.2023.	34.930.991	10.479.297	1.746.550	19.299.372	3.405.772	22.705.144	period izvođenja radova 10.12.2022. - 27.01.2023.
014	8. situacija za Radove	05.04.2023.	30.819.702	9.245.910	1.540.985	17.027.885	3.004.921	20.032.806	period izvođenja radova 28.01.2023. - 24.02.2023.
015	9. situacija za Radove	03.05.2023.	53.519.981	16.055.994	2.675.999	29.569.790	5.218.198	34.787.988	period izvođenja radova 25.02.2023. - 03.04.2023.
016	10. situacija za Radove	31.05.2023.	49.478.209	14.843.463	2.473.910	27.336.711	4.824.125	32.160.836	period izvođenja radova 04.04.2023. - 03.05.2023.
017	11. situacija za Radove	12.07.2023.	55.525.548	16.657.664	2.776.277	30.677.865	5.413.741	36.091.606	period izvođenja radova 04.05.2023. - 01.06.2023.
018	12. situacija za Radove	07.08.2023.	69.384.241	20.815.272	3.469.212	38.334.793	6.764.963	45.099.757	period izvođenja radova 02.06.2023. - 03.07.2023.
019	13. situacija za Radove	19.09.2023.	77.079.449	23.123.835	3.853.972	42.586.396	7.515.246	50.101.642	period izvođenja radova 04.07.2023. - 03.08.2023.
020	14. situacija za Radove	12.10.2023.	43.830.371	13.149.111	2.191.519	24.216.280	4.273.461	28.489.741	period izvođenja radova 04.08.2023. - 01.09.2023.
021	15. situacija za Radove	09.11.2023.	78.508.781	23.552.634	3.925.439	43.376.101	7.654.606	51.030.708	period izvođenja radova 02.09.2023. - 02.10.2023.
023	16. situacija za Radove	01.12.2023.	73.958.923	22.187.677	3.697.946	40.862.305	7.210.995	48.073.300	period izvođenja radova 03.10.2023. - 01.11.2023.
024	17. situacija za Radove	10.01.2024.	46.784.515	14.035.354	2.339.226	25.848.444	4.561.490	30.409.935	period izvođenja radova 02.11.2023. - 30.11.2023.
025	18.situacija za Radove	01.02.2024.	2.018.525	605.558	100.926	1.115.235	196.806	1.312.041	period izvođenja radova 01.12.2023. - 31.12.2023.
026	19.situacija za Radove		92.597.259						period izvođenja radova 01.01.2024. - 31.01.2024.
026 A, C	19.situacija za Radove - budžet	22.03.2024.	13.889.589	4.166.877	694.479		9.028.233	9.028.233	period izvođenja radova 01.01.2024. - 31.01.2024.
026 B, D	19.situacija za Radove - kredit	05.04.2024.	78.707.670	23.612.301	3.935.383	51.159.985		51.159.985	period izvođenja radova 01.01.2024. - 31.01.2024.
027	20.situacija za Radove		27.398.560						period izvođenja radova 01.02.2024. - 29.02.2024.
027 A, C	20.situacija za Radove - budžet	02.04.2024.	4.109.784	1.232.935	205.489		2.671.360	2.671.360	period izvođenja radova 01.02.2024. - 29.02.2024.
027 B, D	20.situacija za Radove - kredit	05.04.2024.	23.288.776	6.986.633	1.164.439	15.137.705		15.137.705	period izvođenja radova 01.02.2024. - 29.02.2024.
Total (USD)			**922.334.340**	**276.682.860**	**46.116.717**	**509.604.549**	**89.930.215**	**599.534.763**	

Aneks ugovora br.2, broj 340-9986/2022 od 09.12.2022., prihvaćeni ugovorni iznos : 6.512.453,59 USD						
Redni Br.	**Opis**	**Datum potpisivanja od strane stručnog Nadzora**	**Iznos plaćanja za izvršene radove (USD)**	**Deo za finansijera**	**Plaćanja za obračunski period (USD)**	**Napomene**
Avansne situacije						
010	Avans Aneks II	12.12.2022.	3.567.000	3.567.000	3.567.000	100% od Prihvaćenog ugovornog iznosa za ostale radove po Aneksu II (radovi - Gasovod Subotica i privremena saobraćajnica na km 113; usluge - projektovanje izmeštanje gasovoda u Subotici, projektovanje privremena saobraćajnica km 113 i arheologija prva faza). Deo za radova u iznosu od 2.278.060,5 USD i deo za usluge u iznosu od 1.288.939,51 USD.
Total (USD)			**3.567.000**	**3.567.000**	**3.567.000**	
Privremene situacije						
011	I privremena Aneks II	12.12.2022.	2.945.454	2.945.454	2.945.454	period izvođenja radova 01.01.2022. - 18.03.2022.
Total (USD)			**2.945.454**	**2.945.454**	**2.945.454**	

Aneks ugovora br.3, broj 340-9166/2023 od 06.10.2023., prihvaćeni ugovorni iznos : 28.137.000,91 USD						
Redni Br.	**Opis**	**Datum potpisivanja od strane stručnog Nadzora**	**Iznos plaćanja za izvršene radove (USD)**	**Deo za finansijera**	**Plaćanja za obračunski period (USD)**	**Napomene**
022	I privremena Aneks III	14.11.2023.	24.993.159	24.993.159	24.993.159	period izvođenja radova 01.01.2023. - 14.11.2023.
Total (USD)			**24.993.159**	**24.993.159**	**24.993.159**	

Plaćanje zadržanog novca

Komercijalni ugovor, broj 340-5583/2018-3 od 07.07.2018.,prihvaćeni ugovorni iznos : 1.162.810.000,00 USD, 5 % ugovorene vrednosti						
Redni Br.	**Opis**	**Oslobađanje zadržanih suma (a)**	**Deo za kinesku EXIM Banku (85%) USD (b=a×85%)**	**Deo za finansijera (15%) USD (c=(a×15%)**	**Plaćanja za obračunski period USD (d=b+c)**	**Napomene**
1	1. deo garantnog depozita	29.070.250	24.709.713	4.360.538	29.070.250	Nakon izdavanja potvrde o prijemu radova
2	2. deo garantnog depozita	29.070.250	24.709.713	4.360.538	29.070.250	Nakon isteka roka za prijavu nedostataka
Total (USD)		**58.140.500**	**49.419.425**	**8.721.075**	**58.140.500**	

5. STATUS PREGLEDA PZI PROJEKTA

Izveštaj o pregledu PZI projektne dokumentacije zaključno sa 14.04.2024.godine

U okviru Nedeljnog izveštaja za period 08.04.2024. – 14.04.2024. godine

1) Projekat za izvođenje radova (PZI) izrađen u skladu sa Građevinskom dozvolom

Stručni Nadzor je izvršio pregled Projekta za izvođenje radova (PZI) izrađenog u skladu sa Građevinskom dozvolom br. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021, zavodni broj: 351-02-03590/2021-07 od 26.10.2021 i rešenjem o izmeni Građevinske dozvole br. ROP-MSGI-27315-CPAH-13/2022, zavodni broj: 351-02-03590/2022-07 od 15.12.2022., što potvrđeno dopisom broj NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2198 od 07.02.2024. godine. (Prilog 1 izveštaja)

PZI projekti/revizije projekata su pregledani od strane stručnog Nadzora i odobrene sa statusom A (PZI projekat se prihvata), uz ranije dat komentar za projekte koji su izuzeti iz pregleda:

- projekti rušenja (11 projekata)
- geotehnički elaborati (152 projekata)

Izvođač radova je u obavezi:

- da sve potrebne izmene ili dopune projekata, u saglasnosti sa lokacijskim uslovima i građevinskom dozvolom, koje se mogu javiti u toku izvođenja radova, pripremi kroz Tehnička rešenja, koja će biti overena od strane Projektanta i dostavljena Nadzoru na saglasnost. Ovako urađena Tehnička rešenja (odstupanja od PZI), koja nisu u suprotnosti sa lokacijskim uslovima i građevinskom dozvolom, će biti implementirane u PIO projekat nakon završetka radova.
- da priprema i ažurno vodi kompletan set evidencije izvedenog stanja projekta a sve u skladu sa članom 38. (Dokumentacija i projekat izvedenog stanja) Komercijalnog Ugovora
- ukoliko se u dokumentaciji Izvođača radova utvrde greške, propusti, dvosmislenosti, neadekvatnosti i ostale manjkavosti, ona podleže korekcijama o trošku Izvođača raodva, u skladu sa članom 39. (Greške u projektovanju) Komercijalnog Ugovora
- Izvođač/Projektant ima obavezu da, ukoliko je potrebno, a u skladu sa zahtevima sertifikacionog tela (NoBo), dopuni projektnu dokumentaciju u cilju dokazivanja ispunjenosti zahteva TSI u matricama u procesu verifikacije podsistema TSI.

2) Projekti izrađeni po posebnoj proceduri

U narednoj tabeli data je retrospektiva dostavljenih PZI projekata (osnovni projekti i revizije projekata), izrađenih po posebnim procedurama, od strane Izvođača radova:

Naziv projekta	Način dotsavljanja	Datum dostavljanja	Osnovni projekti	Revizije projekata
Izmeštanje postojeće kanalizacije u Ložinjskoj ulici u Subotici	HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0018	19.02.2023.	1	0
	HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0025	01.03.2023.	0	1
	Mail Projektanta CIP	10.03.2023.	0	1
Projekat izmeštanja kanala otpadnih voda na km 173+629,56	HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0036	10.03.2023.	1	0
	HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0064	31.03.2023.	0	1
Projekat kanalizacije u ulici Park Rajhla Ferenca u Subotici	HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0077	07.04.2023.	1	0
Projekat nedostajuće infrastrukture železničke stanice Vrbas	HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0340	13.09.2023.	1	0
	HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0367	11.10.2023.	0	1
TEHNO - COOP Subotica magistralni vodovod	HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0450	10.12.2023.	1	0
		Ukupno:	5	4

U narednoj tabeli dat je prikaz pregledane PZI projektne dokumentacije po statusima.

	Status Izveštaja Nadzora			
	A	B	C	Ukupno
Ukupno pregledano	5	0	0	5
Ukupno pregledano revizija projekata:				4

Prema informacijama koje tim Nadzora ima, Izvođač je u obavezi da izradi sledeće PZI projekte koji će biti predmet pregleda o strane tima Nadzora:

- Projekti ukrštaja dalekovoda, EMS. Ukupno 7 projekata
- Projekti priključenja potrošača na distributivnu mrežu (prema uslovima EDB Novi Sad, Sombor i Subotica). Ukupno 33 projekata
- Projekat izmeštanja kolektora DN630 na stacionaži km 116+900

Ukupan broj projekata će biti naknadno utvrđen, nakon dostavljanja od strane Izvođača radova.

3) Nedostajući PZI (prema PGD)

U narednoj tabeli data je retrospektiva dostavljenih Projekata geodetskog osmatranja objekata (osnovni projekti i revizije projekata), od strane Izvođača radova:

Način dotsavljanja	Datum dostavljanja	Osnovni projekti	Revizije projekata
HDJV-NSSB-TEC-IZS-2022-0629	24.11.2022.	3	0
HDJV-NSSB-TEC-IZS-2022-0658	09.12.2022.	5	0
HDJV-NSSB-TEC-IZS-2022-0673	08.12.2022.	13	0
HDJV-NSSB-TEC-IZS-2023-0177	16.03.2022.	0	13
HDJV-NSSB-TEC-IZS-2023-0214	24.03.2023.	0	13
HDJV-NSSB-TEC-IZS-2023-0028	23.01.2023.	2	0
HDJV-NSSB-TEC-IZS-2023-0090	15.02.2023.	17	0
HDJV-NSSB-TEC-IZS-2023-0397	31.05.2023.	7	0
HDJV-NSSB-TEC-IZS-2023-0524	14.07.2023.	3	4
HDJV-NSSB-TEC-IZS-2023-0739	29.09.2023.	4	0
	Ukupno:	**54**	**30**

U narednoj tabeli dat je prikaz pregledanih Projekata geodetskog osmatranja objekata po statusima:

	Status Izveštaja Nadzora			
	A	B	C	Ukupno
Ukupno pregledano	54	0	0	54
Ukupno pregledano revizija projekata:				30

Svi Projekti geodetskog osmatranja objekata su predati od strane Izvođača radova i odobreni statusom A.

Prilog nedeljnom izveštaju:

- Prilog 1_Dopis strčnog Nadzora broj broj NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2198 od 07.02.2024.

Head office of CRIC-CCCC Joint Venture
Rajka Mitića 8
11040 Beograd

Br: NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2198
Datum: 07.02.2024.

Projekat: Pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Novi Sad-Subotica-državna granica

Project: Supervision Services of Reconstruction and Modernization of the railway line Novi Sad – Subotica – State border

---

Predmet: Projekat za Izođenje radova (PZI)

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je izvršen pregled Projekta za izvođenje radova (PZI) izrađenog u skladu sa Građevinskom dozvolom br. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021, zavodni broj: 351-02-03590/2021-07 od 26.10.2021 i rešenjem o izmeni Građevinske dozvole br. ROP-MSGI-27315-CPAH-13/2022, zavodni broj: 351-02-03590/2022-07 od 15.12.2022. od strane stručnog Nadzora.

PZI projekti/revizije projekata su pregledani od strane stručnog Nadzora i odobrene sa statusom A (PZI projekat se prihvata), uz ranije dat komentar za projekte koji su izuzeti iz pregleda:

- projekti rušenja (11 projekata)
- geotehnički elaborati (152 projekata)

Pored PZI projekata izrađenih u skladu sa gore navedenim Građevinskim dozvolama, obaveza Izvođača radova je da izradi i druge projekte potrebne za realizaciju Projekta rekonstrukcije i modernizacije deonice pruge Novi Sad – Subotica – Državna granica:

- projekti koji se izrađuju po posebnoj procedure
- nedostajući projekti za izvođenje (prema PGD-u)

Podsećamo na ostale obaveze Izvođača radova, a u vezi izrade projektno – tehničke dokumentacije:

Subject: Design for Construction (DfC)

Dear,

We hereby inform you that the Supervision has completed the review of the Design for Construction (DfC) prepared in accordance with the Building Permit No. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021, reference number: 351-02-03590/2021-07 dated 26.10.2021 and the Decision on amending the Building Permit No. ROP-MSGI-27315-CPAH-13/2022, reference number: 351-02-03590/2022-07 dated 15.12.2022.

DfCs/DfC revisions have been reviewed by the Supervision and proved with the status "A" (DfC is accepted), with previously provided comment regarding the designs omitted from the review:

- demolition designs (11 designs)
- geotechnical studies (152 designs)

in addition to DfCs prepared in accordance with the above mentioned Building Permits, the Contractor is obliged to prepare other designs required for the implementation of the Project for reconstruction and modernization of the railway section Novi Sad – Subotica – state border:

- designs prepared in accordance to a special procedure
- missing designs for construction (according to the BPD)

We hereby remind the Contractor of its remaining obligations regarding the preparation of design and technical documentation:

• sve potrebne izmene ili dopune projekata, u saglasnosti sa lokacijskim uslovima i građevinskom dozvolom, koje se mogu javiti u toku izvođenja radova, Izvođač treba da pripremi kroz Tehnička rešenja, koja će biti overena od strane Projektanta i dostavljena Nadzoru na saglasnost. Ovako urađena Tehnička rešenja (odstupanja od PZI), koja nisu u suprotnosti sa lokacijskim uslovima i građevinskom dozvolom, će biti implementirane u PIO projekat nakon završetka radova.	• The Contractor should prepare all required modifications and amendments to the designs, in accordance with location conditions and building permit, which may arise during the execution of works, in the forma of technical solutions, which shall be verified by the Designer and submitted to the Supervision for review and approval. Technical solutions prepared in this manner (deviation from DfC), which are not contrary to location conditions and building permit, shall be incorporated into the As-Built Design upon the completion of works,
• priprema i ažurno vođenje kompletnog seta evidencije izvedenog stanja projekta a sve u skladu sa članom 38. (Dokumentacija i projekat izvedenog stanja) Komercijalnog Ugovora	• Preparation and keeping up-to-date the entire set of as-built design records, all in accordance with the Article 38 (As-Built Design and Documentation) of the Commercial Contract.
• ukoliko se u dokumentaciji Izvođača radova utvrde greške, propusti, dvosmislenosti, neadekvatnosti i ostale manjkavosti, ona podleže korekcijama o trošku Izvođača raodva, u skladu sa članom 39. (Greške u projektovanju) Komercijalnog Ugovora	• If certain errors, omissions, ambiguities, inadequacies and other deficiencies are identified in the Contractor's documentation, it shall be subject to corrections performed at the Contractor's expense, all in accordance with the Article 39 (design Errors) of the Commercial Contract.
• Projektant ima obavezu da, ukoliko je potrebno, a u skladu sa zahtevima sertifikacionog tela (NoBo), dopuni projektnu dokumentaciju u cilju dokazivanja ispunjenosti zahteva TSI u matricama u procesu verifikacije podsistema TSI.	• The Designer is obliged to supplement design documentation if necessary, all in accordance with requirements of the certification body (NoBo), in order to prove the fulfillment of TSI requirements given in the matrices in the process of TSI subsystem verification.
U prilogu Vam dajemo pregled dostavljene projektne dokumentacije PZI (i svih revizija projekata), sa ukupnim brojem odobrenih projekata.	Please find enclosed the overview of the submitted DfC documentation (and all design revisions), together with the total number of approved designs.

S poštovanjem/Regards:

Rukovodilac stručnog nadzora/Team Leader
Dragan Gligorov

Pripremio/Prepared by:
Miloš Trajković,
Koordinator tima za kontrolu izrade projekata za izvođenje i druge tehničke dokumentacije /
Coordinator of the design for construction and other documentation control team

Prilog / Attachments:
Prilog 1_Pregled dostavljene projektne dokumentacije PZI u skladu sa građevinskom dozvolom
Attachment 1_Overview of the submitted DFC documentation in accordance with the building permit

Prilog1_Pregled dostavljene projektne dokumentacije PZI u skladu sa Građevinskom dozvolom

U narednoj tabeli data je retrospektiva dostavljenih PZI projekata (osnovni projekti i revizije projekata), izrađenih u skladu sa Građevinskom dozvolom br. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021, zavodni broj: 351-02-03590/2021-07 od 26.10.2021 i rešenjem o izmeni Građevinske dozvole br. ROP-MSGI-27315-CPAH-13/2022, zavodni broj: 351-02-03590/2022-07 od 15.12.2022., po dopisima Izvođača radova. Prilikom dostavljena projektne dokumentacije dopisima dešavalo se da Izvođač radova iste projekte dostavi kroz dva različita dopisa što je u tabeli prikazano u koloni ''Korekcija''.

Dostavljeno PZI Projekti od starne Izvođača Nadzoru					
Način dotsavljanja	Datum dostavljanja	Broj dostavljenih projekata	Osnovni projekti	Revizije projekata	Korekcije
Raniji dopisi		112	90	0	22
HDJV-NSSB-DES-IZS-2021-0020			11		
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0001			4		
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0002			1		
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0004	09.02.2022.	26	23	2	1
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0005	02.03.2022.	31	28	0	3
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0006	08.03.2022.	1	1	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0007	13.03.2022.	9	9	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0009	16.03.2022.	2	2	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0010	17.03.2022.	2	0	0	2
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0011	25.03.2022.	4	3	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0013	08.03.2022.	64	56	0	8
допис ЦИП 250-545/20	11.04.2022.	9	0	9	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0014	20.04.2022.	371	355	4	12
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0019	17.05.2022.	10	0	9	1
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0020	19.05.2022.	131	131	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0022	25.05.2022.	40	32	7	1
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0024	01.06.2022.	2	0	0	2
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0025	02.06.2022.	23	13	10	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0026	07.06.2022.	66	58	8	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0028	10.06.2022.	20	0	20	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0030	17.06.2022.	5	3	2	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0031	23.06.2022.	8	1	7	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0033	29.06.2022.	16	11	5	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0034	04.07.2022.	53	21	32	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0038	06.07.2022.	66	22	44	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0040	11.07.2022.	63	0	63	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0042	13.07.2022.	12	3	9	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0043	19.07.2022.	27	0	27	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0045	21.07.2022.	70	0	70	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0046	25.07.2022.	54	0	54	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0047	01.08.2022.	15	2	13	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0049	05.08.2022.	41	0	41	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0050	09.08.2022.	38	0	38	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0051	12.08.2022.	95	57	38	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0053	16.08.2022.	11	5	6	0

Dostavljeno PZI Projekti od starne Izvođača Nadzoru					
Način dotsavljanja	Datum dostavljanja	Broj dostavljenih projekata	Osnovni projekti	Revizije projekata	Korekcije
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0054	21.08.2022.	30	0	30	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0057	26.08.2022.	9	0	9	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0059	02.09.2022.	18	0	18	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0060	07.09.2022.	154	0	0	154
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0062	11.09.2022.	6	0	6	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0063	16.09.2022.	12	0	12	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0065	23.09.2022.	30	0	30	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0067	29.09.2022.	37	0	37	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0071	07.10.2022.	18	0	18	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0074	16.10.2022.	16	0	16	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0076	21.10.2022.	5	0	5	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0079	28.10.2022.	18	0	18	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0081	01.11.2022.	14	1	13	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0083	04.11.2022.	10	0	10	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0085	08.11.2022.	26	0	26	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0086	12.11.2022.	14	0	14	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0087	18.11.2022.	2	0	2	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0088	21.11.2022.	8	0	8	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0090	28.11.2022.	16	0	12	4
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0093	02.12.2022.	5	0	4	1
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0097	07.12.2022.	20	0	20	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0099	09.12.2022.	28	0	28	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0101	15.12.2022.	17	0	17	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0103	19.12.2022.	3	0	3	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0106	21.12.2022.	5	0	4	1
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0108	26.12.2022.	15	0	15	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0114	30.12.2022.	14	0	14	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0001	04.01.2023.	8	0	8	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0003	12.01.2023.	10	0	10	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0004	17.12.2023.	15	0	15	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0007	20.01.2023.	18	0	16	2
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0008	27.01.2023.	8	0	6	2
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0009	30.01.2023.	4	0	4	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0006	03.02.2023.	7	7	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0010	06.02.2023.	8	1	6	1
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0012	08.02.2023.	1	0	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0015	13.02.2023.	4	0	4	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0017	20.02.2023.	2	0	2	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0021	25.02.2023.	9	0	9	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0026	01.03.2023.	1	0	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0028	05.03.2023.	9	0	9	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0033	13.03.2023.	4	0	4	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0039	19.03.2023.	14	0	13	1

Dostavljeno PZI Projekti od starne Izvođača Nadzoru					
Način dotsavljanja	Datum dostavljanja	Broj dostavljenih projekata	Osnovni projekti	Revizije projekata	Korekcije
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0053	24.03.2023.	8	0	7	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0080	08.04.2023.	16	0	15	1
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0094	18.04.2023.	4	0	0	4
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0107	24.04.2023.	4	0	4	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0108	24.04.2023.	20	0	20	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0109	28.04.2023.	1	0	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0135	12.05.2023.	7	0	7	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0144	19.05.2023.	2	1	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0159	29.05.2023.	2	0	2	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0173	04.06.2023.	1	0	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0184	09.06.2023.	5	0	5	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0221	03.07.2023.	2	0	1	1
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0232	10.07.2023	1	1	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0275	31.07.2023.	8	0	8	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0327	02.09.2013.	19	0	19	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0336	13.09.2023.	1	0	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0356	02.10.2023.	2	0	2	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0363	06.10.2023.	3	0	3	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0371	15.10.2023.	1	0	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0382	24.10.2023.	1	0	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0392	29.10.2023.	3	0	3	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0431	27.11.2023.	2	0	2	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0448	06.12.2023.	1	0	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0042	31.01.2024.	2	0	2	0
Projekti dobijeni mailom		6	0	5	0
	UKUPNO:	2291	937	1128	224
	Dostavljeno do 15.02.2022.	112	90	0	22
	Dostavljeno od 15.02.2022.	2179	847	1128	202

U narednoj tabeli dat je prikaz pregledane PZI projektne dokumentacije po statusima.

	Status Izveštaja Nadzora				
	A	B	C	PGD = PZI	Ukupno
Projekti predati do 15.02.2022. (IŽS)	12	0	0	0	12
Projekti predati od 15.02.2022.	925	0	0	152	925
Ukupno pregledano	937	0	0	152	937
Procentualno (%)	100,00	0,00	0,00		
Ukupno pregledano revizija projekata:					1128

U narednoj tabeli prikazan je broj odobrenih PZI projekata po oblastima.

Naziv projekta	ukupno projekata	status			
		A	B	C	IŽS
0. Glavna sveska	1	1	0	0	0
1. Projekati arhitekture	57	57	0	0	0
2.1.1. Projekti konstrukcija	59	58	0	0	1
2.1.2. Projekti propusta	8	8	0	0	0
2.2. Projekat trase pruge i stanica - donji i gornji stroj	58	58	0	0	0
2.3. Projekti drumskih saobraćajnica	109	106	0	0	3
2.4. Projekti potpornih zidova	7	7	0	0	0
2.5. Geodetska mreža	1	0	0	0	1
2.6. Geodetsko obeležavanje	4	3	0	0	1
2.8. Projekat stubova za potrebe GSM – R sistema	3	3	0	0	0
2.9. Projekat konstrukcije arhitektonskih objekata	96	96	0	0	0
2.10. Izmeštanje i zaštita telekomunikacione infrastrukture -trasa	3	3	0	0	0
2.11. Izmeštanje i zaštita telekomunikacione infrastrukture,građevinski deo kablovske kanalizacije	8	8	0	0	0
2.12. Kablovska trasa za pružne TK kablove	3	3	0	0	0
2.13. Kablovska trasa za pružne TK kablove - ostali	2	2	0	0	0
2.14. Temelji stubova kontaktne mreže	2	1	0	0	1
2.15. Izmeštanja i zaštite gasovoda	6	6	0	0	0
2.16. Retenzije	8	8	0	0	0
3. Hidrotehničke instalacije	30	30	0	0	
4.1.1. Kontaktna mreža	24	24	0	0	0
4.1.2. EVP, PSN i PS	10	10	0	0	0
4.1.3. Upravljanje rastavljačima sa motornim pogonom	21	20	0	0	1
4.1.4. Daljinsko upravljanje SPEV	1	1	0	0	0
4.1.5. Priključak EVP Vrbas na KM	2	2	0	0	0
4.1.6. Uzemljenje konstrukcija	1	1	0	0	0
4.2.1. TS sa KM	59	59	0	0	0
4.2.2. Projekat distributivne transformatorske stanice	14	14	0	0	0
4.2.3. Projekti elektroenergetskih instalacija za objekte	31	31	0	0	0
4.2.4. Projekti spoljnih elektroenergetskih instalacija	15	15	0	0	0
4.2.5. Osvetljenje denivelisanih ukrštaja i pristupnih saobraćajnica	1	1	0	0	0
4.2.6. Izmeštanje i zaštita	3	3	0	0	0
4.2.7. Katodna zaštita	5	5	0	0	0
5.1. Projekti osiguranja	23	23	0	0	0
5.2. Projekat opremanja pruge evropskim sistemom za kontrolu vozova (ETCS L2)	1	1	0	0	0
5.3. Pružni STA kablovi	12	12	0	0	0
5.4. Dispečerski i pružni uređaji	1	1	0	0	0
5.5. Optički kablovi	1	1	0	0	0
5.6. Dojava požara	16	16	0	0	0
5.7. Informaciono komunikacioni sistemi	16	16	0	0	0
5.8. Radio sistemi	4	4	0	0	0
5.9. Izmeštanje i zaštita	12	12	0	0	0

Naziv projekta	ukupno projekata	status			
		A	B	C	IŽS
6.1. Termotehničke instalacije	37	37	0	0	0
6.2. Liftovi	12	12	0	0	0
6.3. Stabilni sistemi za gašenje požara	14	14	0	0	0
6.4. Merne stanice	1	1	0	0	0
6.5. Izmeštanje i zaštita	6	6	0	0	0
7. Projekti tehnologija	7	7	0	0	0
8.1. Projekat tehnologije i organizacije saobraćaja	4	4	0	0	0
8.2.1. Projekat drumske saobraćajne signalizacije i opreme	4	3	0	0	1
8.2.2. Projekat organizacije drumskog saobraćaja u toku izvođenja radova	24	22	0	0	2
8.3. Projekat opreme za informisanje i usmeravanje kretanja	4	4	0	0	0
8.4. Projekat tehnologije i organizacije železničkog saobraćaja za vreme izvođenja radov	2	2	0	0	0
8.5. Projekat likovnih signala i signalnih oznaka	3	3	0	0	0
8.6. Signalizacija plovnih puteva	4	4	0	0	0
9.1. Sinhron plan	3	3	0	0	0
9.2. Uređenje pružnog pojasa	3	3	0	0	0
9.3. Zaštita životne sredine	4	3	0	0	1
9.5. Peroni	14	14	0	0	0
9.6. Spoljno uređenje	10	10	0	0	0
10. Projekti rušenja		0	0	0	0
E1. Geotehnički elaborati	2	2	0	0	0
GPZOP. Glavni projekat zaštite od požara	41	41	0	0	0
UKUPNO:	937	925	0	0	12

Napomena:

- Uz ranije date komentare stručnog Nadzora sledeći PZI projekti su izuzeti iz pregleda:
  - 152 PZI projekata Geotehničkih elaborata (veza mail stučnog Nadzora od 05.10.2022. godine; Subject: Sektor 3 : Geotehnički elaborati)
  - 11 projekata rušenja (veza mail stučnog Nadzora od 27.04.2022. godine; Subject: Re: 20220420+HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0014-关于提交诺苏段部分施工图纸的函) I odgovor Izvođača radova mail-om od 11.05.2022. godine; Subject: Re: 20220420+HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0014-关于提交诺苏段部分施工图纸的函)

6. SASTANCI

Predgled sastanaka sa Izvođačem/Investitorom/Naručiocem u izveštajnom periodu

Tema sastanka	**Lokacija/Učesnici**	**Održan**
Tehnički sastanak – Prijava radova za izgradnju podzemnog kablovskog voda 20kV za TS „TK Vrbas“ na parcelama koje su u privatnoj svojini	Sombor / Nadzor, Izvođač, Investitor, Projektant, ED Sombor	08.04.2024.
Koordinacioni sastanak – AsBo – Rešavanje spornih pitanja, kontrola sa užim timom Radne grupe	IŽS / Nadzor, Izvođač, Investitor	09.04.2024.
Tehnički sastanak – Dinamički plan za sve preostale radove na konstrukcijama	Novi Sad / Nadzor, Izvođač	09.04.2024.
Tehnički sastanak – Rešavanje problema sa izgradnjom kanalizacionih kanala	Gradilište / Nadzor, Izvođač, Projektant	10.04.2024.
Tehnički sastanak – Osiguranje bezbednog rada TS Novi Sad, uspešan završetak radova na rekonstrukciji TS	Novi Sad / Nadzor, Izvođač, Investitor, Podizvođač	10.04.2024.
Tehnički sastanak – Geodetsko snimanje instalacija, snimanje izvedenih radova, ovlašćenja geodetskih agencija	Subotica / Nadzor, Izvođač, Investitor, Finansijer, Podizvođač	10.04.2024.
Tehnički sastanak – Postavljanje TK pulta u CTC centru u stanici Novi Sad	Novi Sad / Nadzor, Izvođač, Investitor	11.04.2024.
Tehnički sastanak – Konstrukcije i stanični objekti DeBo	Novi Sad / Nadzor, Izvođač, Investitor	11.04.2024.
Tehnički sastanak – Plan dinamičkog ispitivanja pruge	Novi Sad / Nadzor, Izvođač, Investitor	11.04.2024.
Tehnički sastanak – Priključenje na električno napajanje budućih mobilnih operatera	Novi Sad / Nadzor, Izvođač	12.04.2024.

7. ZAHTEVI ZA SAGLASNOST SA MATERIJALIMA

TABELA ZAHTEVA ZA ODOBRENJE MATERIJALA (MAR)				15.4.2024	pon
Oblast konstrukcije:	**UKUPNO**	**A-Odobreni**	**B-Odobreni uz korekcije**	**C-Nije odobren**	**U TOKU**
ARHITEKTONSKI RADOVI - S1	110	60	22	21	7
ARHITEKTONSKI RADOVI - S2	465	203	105	74	83
RADOVI NA DONJEM STROJU - S1	232	133	54	34	11
RADOVI NA DONJEM STROJU - S2	239	126	53	56	3
KONSTRUKCIJE - S1	37	20	0	5	4
KONSTRUKCIJE - S2	23	17	0	2	4
RADOVI NA GORNJEM STROJU - S1	766	526	77	92	71
RADOVI NA GORNJEM STROJU - S2	658	382	112	80	82
HIDRO RADOVI - S1	109	58	19	22	8
HIDRO RADOVI - S2	222	102	34	81	4
KONTAKTNI SISTEMI I MREŽA - S1	76	49	5	20	2
KONTAKTNI SISTEMI I MREŽA - S2	39	35	1	0	2
ELEKTRO RADOVI - S1	428	265	44	84	35
ELEKTRO RADOVI - S2	384	331	13	23	17
TELEKOMUNIKACIJE - S1	8	4	0	4	0
TELEKOMUNIKACIJE - S2	0	0	0	0	0
MEHANIČKI RADOVI - S1	166	108	20	28	9
MEHANIČKI RADOVI - S2	406	180	46	172	5
PUTNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA - S1	29	22	0	3	4
PUTNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA - S2	193	62	31	67	33
PEJZAŽNO UREĐENJE, PERONI I MERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - S1	16	3	4	9	0
PEJZAŽNO UREĐENJE, PERONI I MERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - S2	0	0	0	0	0
RUŠENJA - S1	0	0	0	0	0
RUŠENJA - S2	0	0	0	0	0

8. STATUS RADOVA

		STATUS RADOVA	UKUPNA FIZIČKA REALIZACIJA NA CELOJ DEONICI	NAPOMENA	ROK ZA ZAVRŠETAK RADOVA	
1	Arhitektonski radovi					
	DEONICA 1 (Novi Sad - Vrbas) čvor Novi Sad km76+501 - km112+982	86,00%	66%	Radovi u toku	31.11.2024.	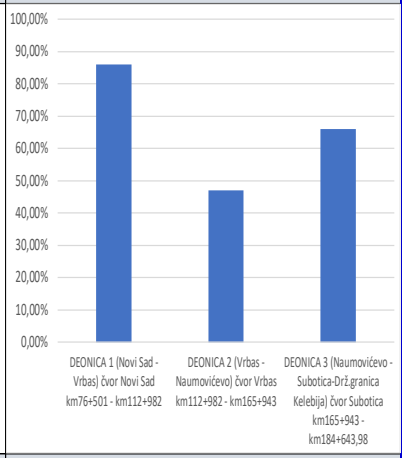
	DEONICA 2 (Vrbas - Naumovićevo) čvor Vrbas km112+982 - km165+943	47,00%		Radovi u toku		
	DEONICA 3 (Naumovićevo - Subotica-Drž.granica Kelebija) čvor Subotica km165+943 - km184+643,98	66,00%		Radovi u toku		
2	Radovi na donjem stroju					
	DEONICA 1 (Novi Sad - Vrbas) čvor Novi Sad km76+501 - km112+982	97%	94%	Radovi u toku	31.07.2024.	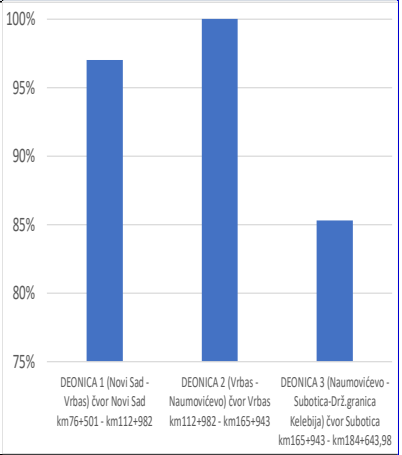
	DEONICA 2 (Vrbas - Naumovićevo) čvor Vrbas km112+982 - km165+943	100%		Radovi u toku		
	DEONICA 3 (Naumovićevo - Subotica-Drž.granica Kelebija) čvor Subotica km165+943 - km184+643,98	85%		Radovi u toku		
3	Radovi na gornjem stroju					
	NABAVKA TUCANIKA [m3]	75%	75%	nabavka u toku	30.09.2024.	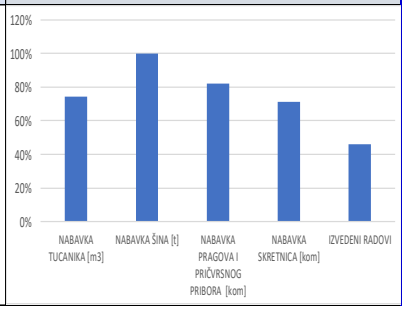
	NABAVKA ŠINA [t]	100%		nabavka u toku		
	NABAVKA PRAGOVA I PRIČVRSNOG PRIBORA [kom]	82%		nabavka u toku		
	NABAVKA SKRETNICA [kom]	71%		nabavka u toku		
	IZVEDENI RADOVI	46%		Radovi u toku		

100%
95%
90%
85%
80%
75%
DEONICA 1 (Novi Sad - Vrbas) čvor Novi Sad km76+501 - km112+982
DEONICA 2 (Vrbas - Naumovićevo) čvor Vrbas km112+982 - km165+943
DEONICA 3 (Naumovićevo - Subotica-Drž.granica Kelebija) čvor Subotica km165+943 - km184+643,98

4	Mostovi, propusti i podvožnjaci					
	DEONICA 1 (Novi Sad - Vrbas) čvor Novi Sad km76+501 - km112+982	90%	86%	Radovi u toku	30.06.2024.	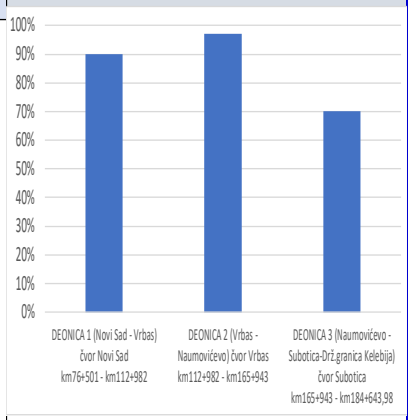
	DEONICA 2 (Vrbas - Naumovićevo) čvor Vrbas km112+982 - km165+943	97%		Radovi u toku		
	DEONICA 3 (Naumovićevo - Subotica-Drž.granica Kelebija) čvor Subotica km165+943 - km184+643,98	70%		Radovi u toku		
5	Pristupni putevi i devijacije					
	DEONICA 1 (Novi Sad - Vrbas) čvor Novi Sad km76+501 - km112+982	30%	66%	nema radova	30.04.2024.	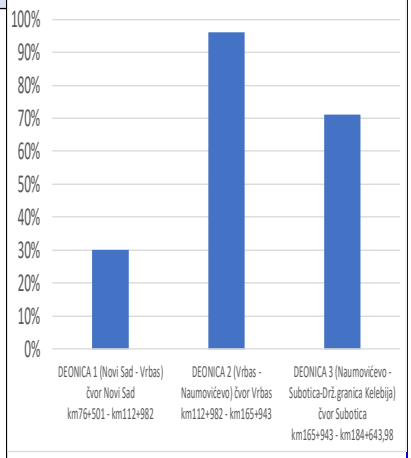
	DEONICA 2 (Vrbas - Naumovićevo) čvor Vrbas km112+982 - km165+943	96%		nema radova		
	DEONICA 3 (Naumovićevo - Subotica-Drž.granica Kelebija) čvor Subotica km165+943 - km184+643,98	71%		Radovi u toku		
6	Drenažni radovi					
	DEONICA 1 (Novi Sad - Vrbas) čvor Novi Sad km76+501 - km112+982	71%	60%	Radovi u toku	31.05.2024.	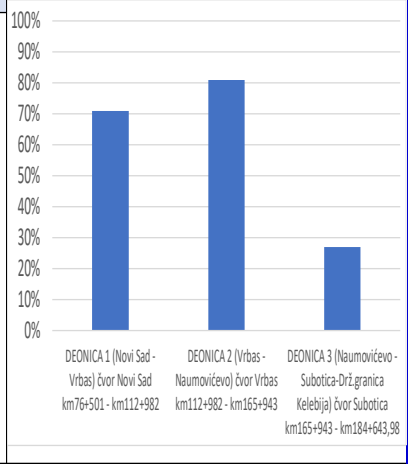
	DEONICA 2 (Vrbas - Naumovićevo) čvor Vrbas km112+982 - km165+943	81%		Radovi u toku		
	DEONICA 3 (Naumovićevo - Subotica-Drž.granica Kelebija) čvor Subotica km165+943 - km184+643,98	27%		Radovi u toku		

7	Kontaktna mreža					
	Građevinski radovi	86%	75%		30.09.2024.	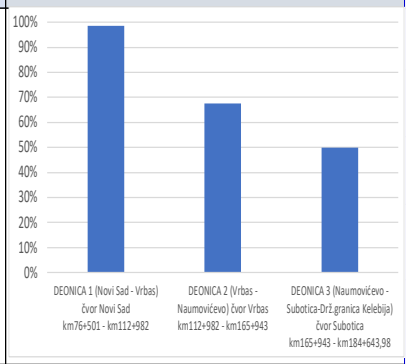
	Elektro radovi	72%				
	DEONICA 1 (Novi Sad - Vrbas) čvor Novi Sad km76+501 - km112+982	99%				
	DEONICA 2 (Vrbas - Naumovićevo) čvor Vrbas km112+982 - km165+943	68%				
	DEONICA 3 (Naumovićevo - Subotica-Drž.granica Kelebija) čvor Subotica km165+943 - km184+643,98	50%				
8	Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS					
	Nabavka materijala i građevinski radovi		49%		30.09.2024.	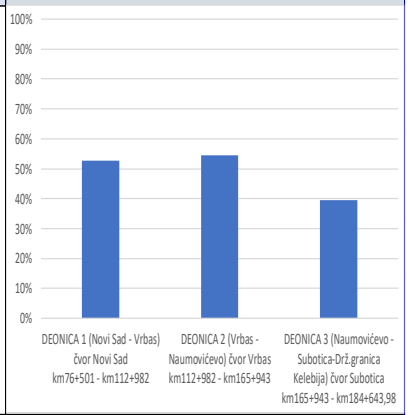
	Elektro radovi					
	DEONICA 1 (Novi Sad - Vrbas) čvor Novi Sad km76+501 - km112+982	53%				
	DEONICA 2 (Vrbas - Naumovićevo) čvor Vrbas km112+982 - km165+943	54%				
	DEONICA 3 (Naumovićevo - Subotica-Drž.granica Kelebija) čvor Subotica km165+943 - km184+643,98	39%				
9	Napajanje					
	Trafo stanica napajana sa KM 25/0.23 kV	0%	62%	Ne radi se.	30.09.2024.	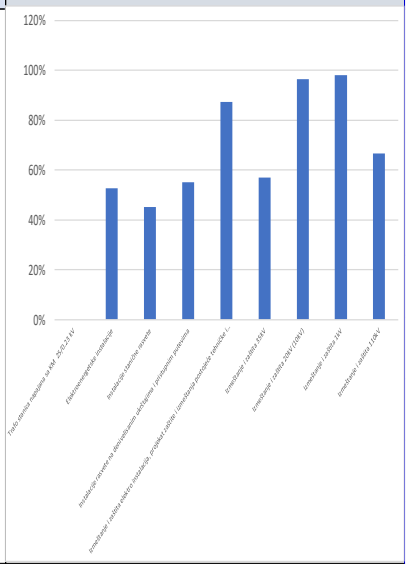
	Elektroenergetske instalacije	53%		Radovi u toku		
	Instalacije stanične rasvete	45%		Radovi u toku		
	Instalacije rasvete na denivelisanim ukrštajima i pristupnim putevima	55%		Radovi u toku		
	Izmeštanje i zaštita elektro instalacija, projekat zaštite i izmeštanja postojeće tehničke i komunalne infrastrukture	87%		Radovi u toku		
	Izmeštanje i zaštita 35kV	57%		Radovi u toku		
	Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV)	96%		Radovi u toku		
	Izmeštanje i zaštita 1kV	98%		Radovi u toku		
	Izmeštanje i zaštita 110kV	67%		Usaglašavanje sa EMS - projekti.		

10	Signalno-sigurnosni sistemi					
	Nabavka materijala	85%	79%	u toku	30.09.2024.	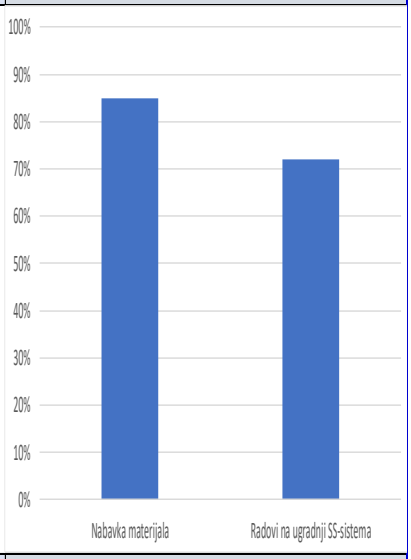
	Radovi na ugradnji SS-sistema	72%		u toku		
11	Telekomunikacioni sistemi					
	Nabavka materijala	90%	72%	u toku	30.09.2024.	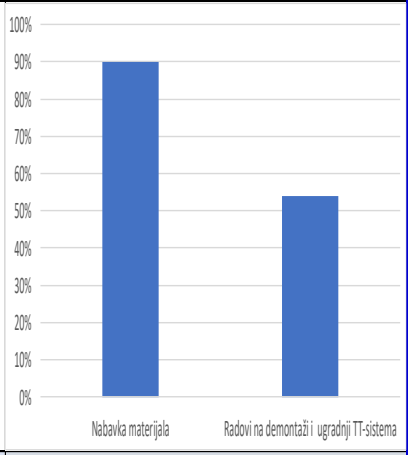
	Radovi na demontaži i ugradnji TT-sistema	54%		Demontažni radovi završeni. Radovi na instalacijama stanice NS u toku kao i Kolizije		
12	Termotehničke i protivpožarne instalacije					
	Termotehničke instalacije u zgradama	57%	33%	u toku	30.09.2024.	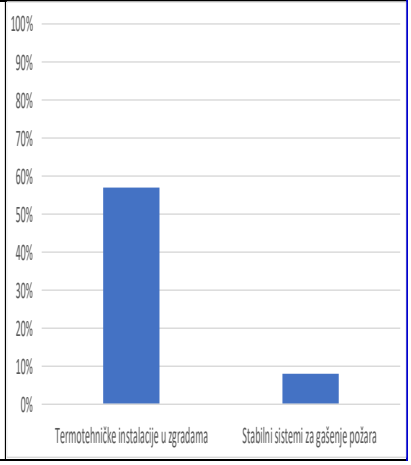
	Stabilni sistemi za gašenje požara	8%		u toku		

13	Mašinske instalacije i radovi					
	Liftovi	33%	8%	u toku	30.09.2024.	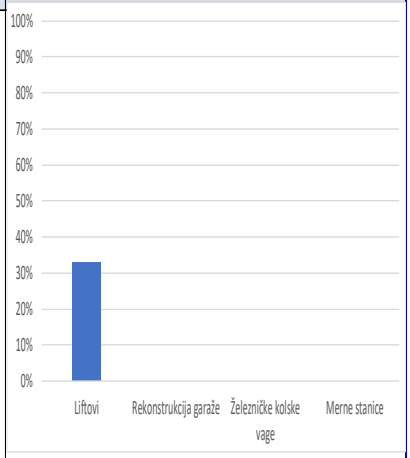
	Rekonstrukcija garaže	0%		Radovi nisu započeti		
	Železničke kolske vage	0%		Radovi nisu započeti		
	Merne stanice	0%		Radovi nisu započeti		
14	Putna saobraćajna signalizacija i oprema					
		0%	0%	Radovi nisu započeti	03.04.2024.	
15	Pejzažno uređenje, peroni i mere zaštite životne sredine					
	DEONICA 1 (Novi Sad - Vrbas) čvor Novi Sad km76+501 - km112+982		91%		30.09.2024.	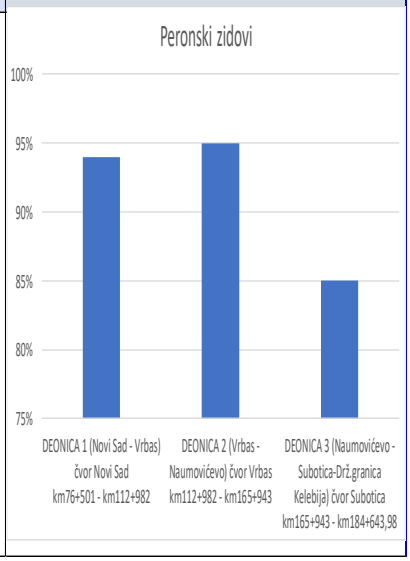
	Peronski zidovi	94%				
	DEONICA 2 (Vrbas - Naumovićevo) čvor Vrbas km112+982 - km165+943					
	Peronski zidovi	95%				
	DEONICA 3 (Naumovićevo - Subotica-Drž.granica Kelebija) čvor Subotica km165+943 - km184+643,98					
	Peronski zidovi	85%				

Peronski zidovi
100%
95%
90%
85%
80%
75%
DEONICA 1 (Novi Sad - Vrbas) čvor Novi Sad km76+501 - km112+982
DEONICA 2 (Vrbas - Naumovićevo) čvor Vrbas km112+982 - km165+943
DEONICA 3 (Naumovićevo - Subotica-Drž.granica Kelebija) čvor Subotica km165+943 - km184+643,98
